

Projet Production et Valorisation des Plantes Aromatiques et Médicinales (PVPAM)

Organisation Maître d'Œuvre du Projet :

High Atlas Foundation (HAF)

En collaboration avec l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et la Communauté de Rhamna

Membres de l'Équipe :

Abdelhamid El Hamrani

Hajar Hazmiri

Mariam Diakite

Ichraq Ait Dahman

Taha Raouki

Décembre 2025

Table des matières

1. Introduction :	4
2. Identification de la problématique / opportunité :	4
2.1 Du contexte territorial à la problématique ciblée :	4
2.2 Problématique centrale et enjeux	4
2.3 Résultats issus de l'arbre à problèmes / champ de forces	5
2.4 Réceptivité et prévention des résistances au changement	5
2.5 Pertinence du projet	5
3. Cadre Logique :	7
4. Analyse des risques anticipés :	11
5. L'analyse de la faisabilité et rythme d'introduction du changement :	13
1) Faisabilité technique :	13
2) Faisabilité logistique :	13
3) Faisabilité légale et réglementaire :	13
4) Faisabilité sociale et culturelle :	13
5) Faisabilité financière et matérielle :	13
6) Faisabilité environnementale :	13
7) Faisabilité organisationnelle et rythme d'introduction du changement :	13
6. Gestion des parties prenantes :	14
7. Structure de Gestion de projet :	16
8. Planification du projet :	
8.1. Planification de la Dimension technique :	19
9. Planification de la Dimension Coût:	
9.1 Budget par activité :	23
10. Stratégie de durabilité et de pérennisation du changement :	28
11. Mécanismes de suivi-évaluation (M&E) et pilotage du changement :	29
Références Bibliographiques :	33
Annexes :	34
Fiches d'activité :	34

Liste des acronymes :

- PVPAM : Production et Valorisation des Plantes Aromatiques et Médicinales
- PAM : Plantes Aromatiques et Médicinales
- HAF : High Atlas Foundation
- INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain
- DAE : Division de l'Action Économique
- DIAH : Développement International et Action Humanitaire
- ONSSA : Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires
- SOP : Standard Operating Procedures (procédures opérationnelles standard)
- COPIL : Comité de Pilotage
- CCT : Comité Consultatif Technique
- S&E : Suivi et Évaluation
- CMR : Cadre de Mesure du Rendement
- GIE : Groupement d'Intérêt Économique
- PLV : Publicité sur le Lieu de Vente

1. Introduction :

Le projet Production et Valorisation des Plantes Aromatiques et Médicinales (PVPAM) est une initiative de développement rural intégrée mise en œuvre dans la commune de Had Hrara (province de Rhamna), un territoire semi-aride confronté à un stress hydrique croissant et à une précarité socio-économique qui affecte particulièrement les femmes et les jeunes. Dans ce contexte, le PVPAM vise à transformer des contraintes structurelles (climat, faibles débouchés, dépendance aux intermédiaires) en opportunité économique durable à partir d'une ressource adaptée au territoire : les plantes aromatiques et médicinales (PAM).

L'objectif central du projet est de mettre en fonctionnement une filière locale intégrée de culture, transformation et commercialisation de PAM, sur une parcelle de 5 hectares conduite en agriculture biologique. Le projet prévoit la mise en place d'une unité de valorisation in situ (séchage, extraction, conditionnement) et l'accompagnement de 20 femmes, dont 7 leaders identifiées dès la mobilisation, afin de générer des revenus plus stables, renforcer l'autonomie économique des bénéficiaires et valoriser durablement les ressources du territoire.

L'organisation maître d'œuvre est la High Atlas Foundation (HAF), ONG spécialisée dans le développement rural participatif, l'agroécologie et l'autonomisation économique des communautés locales. La HAF assure l'appui technique, agronomique et organisationnel, tout en sécurisant les exigences de gestion et de redevabilité attendues par les partenaires. Le projet est mis en œuvre en partenariat avec l'INDH, la Commune de Had Hrara, la DAE, ainsi qu'avec la porteuse de projet, jeune entrepreneure locale, appelée à porter la dynamique de terrain et la structuration progressive de la future organisation collective.

La conception du projet et la présente section s'appuient sur une démarche inspirée de la gestion de projet en DIAH : analyse documentaire, échanges dirigés avec les parties prenantes et relecture collective du diagnostic, afin d'assurer la cohérence entre problématique – objectifs – résultats – indicateurs.

2. Identification de la problématique / opportunité :

2.1 Du contexte territorial à la problématique ciblée :

Had Hrara et plus largement la province de Rhamna font face à des contraintes typiques des zones semi-arides : pluviométrie faible et irrégulière, pression sur les nappes phréatiques, sols sablo-limoneux exigeant une gestion fine de l'eau, et forte exposition aux effets du changement climatique. Ces facteurs fragilisent les systèmes agricoles traditionnels et rendent les revenus ruraux très sensibles aux chocs climatiques.

Sur le plan socio-économique, la commune est marquée par un faible niveau d'instruction, des opportunités d'emploi limitées et une dépendance à des activités à faible valeur ajoutée. Les jeunes quittent progressivement le milieu rural, tandis que de nombreuses femmes restent en marge des circuits économiques formels et des espaces de décision, alors même qu'elles constituent un levier central pour la résilience des ménages.

En affinant le diagnostic, l'analyse révèle toutefois un potentiel productif local encore sous-valorisé : le territoire se prête à la culture de PAM résilientes (menthe, verveine, romarin, sauge, moringa, fenugrec), adaptées au stress hydrique et recherchées sur les marchés. Pourtant, lorsque ces plantes sont produites, elles sont souvent vendues à l'état brut à des intermédiaires, ce qui empêche la communauté de capter la marge liée à la transformation et à la qualité.

Ainsi, en partant d'une vulnérabilité rurale et hydrique générale, puis en ciblant les mécanismes économiques locaux, le diagnostic fait émerger une problématique centrale : l'absence d'une filière locale intégrée de PAM, techniquement maîtrisée et collectivement structurée, permettant de convertir une contrainte environnementale en opportunité économique durable.

2.2 Problématique centrale et enjeux :

La problématique principale peut être formulée ainsi : comment structurer, à Had Hrara, une filière de production–transformation–commercialisation de PAM qui génère des revenus décents pour 20 femmes bénéficiaires, tout en respectant les contraintes hydriques et les exigences de qualité ?

Cette problématique recouvre quatre enjeux principaux. D'abord, un enjeu technique et environnemental : adopter des itinéraires biologiques adaptés (gestion de l'eau, fertilisation organique, biocontrôle) pour réduire la vulnérabilité climatique. Ensuite, un enjeu socio-économique et de genre : permettre aux femmes d'accéder à des compétences, à un outil de production et à une dynamique d'organisation collective, afin de sécuriser des revenus et renforcer leur place dans la gouvernance locale. Troisièmement, un enjeu organisationnel : disposer d'une infrastructure et de procédures standardisées (hygiène-qualité, traçabilité, SOP) permettant une production stable et conforme. Enfin, un enjeu commercial : réduire la dépendance aux intermédiaires en construisant des débouchés réels (points de vente ciblés, ventes pilotes, retours clients, identité produit). Sans intervention structurée, ces sous-problèmes se renforcent mutuellement : la contrainte climatique accentue la précarité économique, qui limite l'investissement dans la qualité et l'innovation, ce qui maintient la dépendance aux intermédiaires et fragilise la capacité des femmes à s'organiser durablement.

2.3 Résultats issus de l'arbre à problèmes / champ de forces :

L'analyse participative met en évidence des causes racines : un modèle agricole peu résilient, un accompagnement insuffisant des femmes vers des activités à plus forte valeur ajoutée, l'absence de dispositifs locaux de transformation et de commercialisation, et une gouvernance économique fragmentée sans structure collective fonctionnelle. Les effets observés sont des revenus faibles et irréguliers, une forte dépendance à des acteurs externes, la persistance des inégalités de genre, et une tendance à l'exode rural des jeunes faute de perspectives.

Le champ de forces montre cependant des forces motrices significatives : la demande croissante pour les produits bio et locaux, l'existence d'acteurs institutionnels susceptibles de soutenir l'inclusion économique (INDH, commune, DAE), la disponibilité d'une parcelle de 5 hectares et la présence d'une porteuse de projet motivée, ainsi qu'un intérêt réel de femmes prêtes à s'engager dans une activité génératrice de revenus. L'enjeu devient alors d'articuler ces forces favorables dans un projet cohérent, capable de lever les contraintes identifiées.

2.4 Réceptivité et prévention des résistances au changement :

La mise en place d'une filière intégrée implique des changements importants : nouvelles pratiques agroécologiques, travail collectif structuré, respect de normes de qualité (ONSSA/Bio) et relation avec des marchés plus exigeants. Ces changements peuvent susciter des résistances. Du côté des bénéficiaires, les freins peuvent prendre la forme d'une crainte du risque économique, d'une inquiétude liée à la charge de travail additionnelle, ou d'une méfiance envers les structures collectives en raison d'expériences passées jugées peu concluantes. Au niveau communautaire, la mise en avant des femmes peut bousculer certains rôles traditionnels, avec d'éventuelles réticences familiales. Enfin, au niveau institutionnel, les délais administratifs (autorisations, contrôles, certification) peuvent ralentir la dynamique.

Pour renforcer la réceptivité, le PVPAM intègre dès la conception des mesures concrètes : une mobilisation progressive (information, échanges avec les familles, sélection basée sur la motivation), une approche learning by doing renforcée par le tutorat pair-à-pair pour sécuriser l'appropriation technique, une gouvernance participative donnant une place structurée aux bénéficiaires tout en maintenant le dialogue avec les institutions, et une stratégie de résultats rapides (lots tests et ventes pilotes) pour rendre visibles les bénéfices et limiter le décrochage. Cette logique est cohérente avec les recommandations méthodologiques en DIAH : identifier les sources de résistance, proposer des mesures réalistes et les relier aux activités du cadre logique.

2.5 Pertinence du projet :

La pertinence du PVPAM est d'abord environnementale et technique : le choix d'espèces xérophiles et l'irrigation économe permettent de mieux composer avec le stress hydrique tout en préservant les ressources. Elle est ensuite socio-économique et de genre : le projet cible explicitement l'autonomisation de 20 femmes (dont 7 leaders), en leur apportant compétences, outil productif et accès au marché. Elle est également institutionnelle et stratégique, car l'intervention s'inscrit dans les orientations de développement territorial et d'inclusion économique portées par les partenaires publics, et contribue à des objectifs de durabilité et d'emploi.

Au final, la problématique ne renvoie pas uniquement à un manque de revenus : elle traduit un déficit de filière et de maîtrise de la chaîne de valeur. Le PVPAM se positionne comme une réponse structurée qui articule diagnostic participatif, renforcement des capacités, gouvernance inclusive et valorisation économique durable des ressources locales.

3. Cadre Logique :

Le cadre logique ci-après formalise la stratégie d'intervention du projet PVPAM dans la communauté rurale de Had Hrara. Il décrit, de l'objectif global jusqu'aux activités, comment la mise en place d'une filière locale de production, transformation et commercialisation de plantes aromatiques et médicinales (PAM) portée par 20 femmes productrices dont 7 leaders doit contribuer à l'amélioration durable de leurs conditions de vie. Les cinq composantes du projet (renforcement des capacités, production sur 5 ha, unité de transformation, débouchés commerciaux, gouvernance et suivi-évaluation) sont présentées avec leurs indicateurs vérifiables, sources de vérification et hypothèses de risques, de manière à offrir une base commune pour la planification opérationnelle, le suivi-évaluation et la pérennisation de la filière.

[illegible]

Cadre Logique : Projet Production et Valorisation des Plantes Aromatiques et Médicinales (Nouvelle Version)

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
	5. Un dispositif de gouvernance, de suivi-évaluation et de pérennisation de la filière PAM est opérationnel et approprié par les parties prenantes au terme des 12 mois de projet.	- Nombre de réunions des instances de gouvernance tenues (COPIL et CCT) . Cible : au moins 4 réunions de COPIL et 6 réunions de CCT tenues, avec un taux moyen de participation ≥ 70 %. - Existence d'un plan de pérennisation triennal validé et nombre de démarches concrètes engagées pour la pérennisation (formalisation de structure, demandes d'agrément, financements complémentaires). Cible : 1 plan de pérennisation adopté + au moins 3 démarches administratives ou partenariales documentées.	Procès-verbaux de réunions du COPIL et du CCT, listes de présence signées, ordres du jour. - Version validée du Cadre de Mesure du Rendement (CMR) et tableaux de bord de suivi mis à jour (fichiers Excel, registres). - Plan de pérennisation de la filière PAM (document approuvé par le COPIL). - Copies des dossiers administratifs et partenariaux déposés (statuts de coopérative ou GIE, demandes d'agrément, dossiers de financement), courriels d'échanges avec les partenaires.	- Que les membres des instances de gouvernance restent disponibles et engagés pendant l'entièreté de la durée du projet. - Que le contexte réglementaire et socio-économique permet la formalisation d'une structure de gestion pérenne (coopérative, GIE ou autre) et l'accès à des dispositifs de financement complémentaires après la période de subvention.
	Composante 1 – Renforcement des compétences techniques et organisationnelles des bénéficiaires			
	A1.1 – Mobiliser et sélectionner les bénéficiaires du projet selon des critères techniques, sociaux et de parité, incluant l'identification d'au moins 7 femmes leaders..	Nombre de bénéficiaires sélectionnés pour le parcours de montée en compétences. Cible : 20 bénéficiaires. Nombre de femmes leaders identifiées et engagées dans le parcours. Cible : 7 femmes leaders.	Listes de présence et formulaires d'inscription complétés lors des sessions de mobilisation communautaire. Procès-verbal de sélection signé par l'équipe de coordination du projet.	- Que les membres de la communauté ciblée soient disponibles et disposés à participer au processus de sélection, permettant l'identification d'au moins 7 femmes leaders selon les critères établis.
	A1.2 – Concevoir et structurer un programme de formation technique et pratique couvrant la culture biologique, le séchage, la transformation artisanale et les règles d'hygiène-qualité.	Nombre de modules de formation élaborés et validés. Cible : 3 modules. Existence d'un calendrier structuré des sessions de formation. Cible : 1 calendrier.	Modules de formation rédigés et archivés. Calendrier de formation validé et communiqué aux bénéficiaires.	- Que les intervenants techniques externes (agronomes, formatrices PAM, expertes hygiène-qualité) soient régulièrement disponibles pour contribuer à la validation technique du programme de formation.
	A1.3 – Organiser et animer des sessions pratiques de formation sur la culture biologique, le séchage naturel, la transformation artisanale et les règles d'hygiène-qualité.	Nombre de sessions pratiques réalisées. Cible : 3 sessions. Proportion des bénéficiaires ayant participé aux sessions. Cible : ≥ 70 %.	Feuilles de présence signées et fiches de session archivées.	- Que les bénéficiaires soient disponibles de manière régulière pour participer aux sessions pratiques aux dates programmées.
	A1.4 – Mettre en place et accompagner un système de tutorat pair-à-pair permettant aux bénéficiaires expérimentés d'appuyer les nouveaux apprenants dans l'acquisition des compétences techniques et organisationnelles.	Nombre de groupes de tutorat pair-à-pair constitués. Cible : 3 groupes. Nombre de séances de tutorat réalisées. Cible : 6 séances.	Listes des groupes de tutorat et fiches de suivi des séances archivées.	- Que les bénéficiaires expérimentés soient disposés à accompagner régulièrement leurs pairs dans le cadre du tutorat.
	A1.5 – Assurer un accompagnement individualisé des bénéficiaires à travers des séances de suivi technique sur parcelle afin de consolider les compétences acquises.	Nombre de sessions d'évaluation des acquis réalisées. Cible : 3.	Fiches d'évaluation et grilles d'observation archivées.	Que le niveau d'alphabétisation et de compréhension des bénéficiaires permette l'utilisation d'outils d'évaluation simples (questions orales, exercices pratiques guidés, fiches très simplifiées).
	Composante 2 – Mise en production biologique des PAM sur les 5 hectares			
	A2.1 – Préparer les parcelles de culture en réalisant le nettoyage, le nivellement, le tracé des planches et l'amendement organique initial conformément aux itinéraires techniques bio.	Surface de parcelles préparées selon les spécifications techniques établies. Cible : 5 hectares.	Rapports de terrain et fiches de suivi agronomique documentant les opérations de préparation des parcelles (photos datées, relevés de surface, enregistrements des apports organiques).	
	A2.2 – Installer les plants et semences biologiques sur les parcelles préparées en respectant les densités, espacements et itinéraires techniques adaptés aux espèces sélectionnées (verveine, menthe, romarin, moringa).	Surface effectivement plantée avec des semences/plantules biologiques conformes au plan de culture. Cible : 5 hectares.	Fiches de plantation, relevés de densité/espacement, et photos géolocalisées renseignées par l'équipe de terrain.	

Cadre Logique : Projet Production et Valorisation des Plantes Aromatiques et Médicinales (Nouvelle Version)

Activités

Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
A2.3 – Réaliser l'entretien agroécologique des cultures à travers une irrigation raisonnée, des binages réguliers, et l'application de biopréparations organiques autorisées (dont le liquide à base de piments) pour la protection phytosanitaire biologique.	Nombre de cycles d'entretien agroécologique réalisés (irrigation, binage, application des biopréparations). Cible : 6 cycles complets. (12mois / 2)	Registres d'entretien et fiches de suivi phytosanitaire documentant les irrigations, binages et applications de biopréparations (avec photos datées).	- Que les conditions climatiques, l'état initial des sols et les ressources hydriques du puit permettent la réalisation régulière des opérations agricoles prévues sur toute la période de mise en culture.
A2.4 – Assurer un suivi agronomique régulier de l'évolution des cultures à travers des visites de parcelles, des observations de croissance et des relevés de l'état sanitaire afin d'anticiper les ajustements techniques nécessaires.	Nombre de visites agronomiques réalisées sur les parcelles. Cible : 6 visites dans l'année. (12mois / 2)	Fiches de visite agronomique et grilles d'observation renseignées par l'équipe de terrain (avec photos datées).	
A2.5 – Réaliser la récolte, le séchage et le tri des plantes aromatiques et médicinales issues de la production pilote, en appliquant les bonnes pratiques agroécologiques enseignées.	Volume total de biomasse récoltée, séchée et triée conformément aux protocoles de post-récolte définis.	Fiches de récolte, registres de séchage et rapports de tri documentés	
Composante 3 – Mise en place et opérationnalisation de l'unité locale de transformation			
A3.1 – Identifier, aménager et équiper un local adapté pour accueillir l'unité de transformation des PAM selon les normes d'hygiène et de sécurité requises.	Nombre de locaux visités et évalués selon la grille d'exigences d'hygiène et de sécurité. Cible : Minimum 3 locaux évalués.	Rapports de visite et grilles d'évaluation,	Que des locaux conformes aux normes minimales d'hygiène et de sécurité soient disponibles dans la communauté de Rhamna.
A3.2 – Aménager et préparer le local retenu conformément aux exigences techniques et sanitaires d'une unité de transformation artisanale.	Taux de conformité du local aménagé par rapport aux normes établies (hygiène, ventilation, surfaces de travail). Cible : ≥ 80 % de conformité selon la grille technique.	Fiche d'inspection d'aménagement remplie par l'équipe technique ; photos avant/après.	Que les travaux d'aménagement puissent être réalisés dans les délais prévus sans contraintes climatiques ou matérielles majeures.
A3.3 – Installer les équipements essentiels de transformation (séchoir, matériel de tri, matériel d'extraction, matériel de conditionnement).	Taux d'équipements installés et fonctionnels par rapport à la liste prévue. Cible : ≥ 90 % des équipements installés et testés.	Fiches techniques d'installation et tests de fonctionnement ; certificats de réception technique.	Que l'alimentation électrique locale soit suffisamment stable pour permettre le fonctionnement régulier des équipements de transformation.
A3.4 – Élaborer et valider les procédures opérationnelles (SOP) de transformation : séchage, tri, extraction, conditionnement.	Nombre de procédures opérationnelles standard (SOP) élaborées et validées. Cible : 4 SOP finalisées (séchage – tri – extraction – conditionnement).	Nombre de procédures opérationnelles standard (SOP) élaborées et validées. Cible : 4 SOP finalisées (séchage – tri – extraction – conditionnement).	Que les experts techniques externes (hygiène-qualité, PAM, agro-transformation) soient disponibles pour accompagner le processus de validation technique.
A3.5 – Tester les équipements et les procédures opérationnelles à travers une séance de mise en route contrôlée.	Nombre de tests de fonctionnement réalisés pour chaque étape de transformation. Cible : 1 test fonctionnel complet par processus (4 processus testés).	Fiches de test, checklists opérationnelles, rapports de mise en route (avec photos datées).	Que l'ensemble des équipements installés soit exempt de défauts techniques majeurs lors des premiers tests.
Composante 4 – Développement des débouchés et première commercialisation pilote			
A4.1 – Identifier et cartographier les points de vente locaux pertinents pour la commercialisation pilote.	Nombre de points de vente locaux identifiés et cartographiés lors de la prospection initiale. Cible : ≥ 5 points de vente.	Fiche de cartographie des points de vente (localisation, contact, type d'établissement).	Que les établissements commerciaux ciblés soient disponibles et disposés à recevoir l'équipe de prospection.
A4.2 – Réaliser des visites de prospection pour présenter les produits PAM et initier le dialogue commercial.	Nombre de visites de prospection effectuées auprès des points de vente identifiés. Cible : ≥ 5 visites.	Fiches de visite de prospection, comptes rendus datés.	Que les gestionnaires des points de vente manifestent un intérêt minimal pour des produits locaux et naturels.
A4.3 – Formaliser au moins deux accords de vente pilote avec les points de vente volontaires.	Nombre d'accords de vente pilote formalisés (engagement écrit, bon de commande ou protocole d'essai). Cible : ≥ 2 accords formels.	Copies des accords de vente pilote signés (ou bons de commande).	Que les points de vente acceptent de tester les produits PAM dans le cadre d'une première vente pilote, sans exigence excessive de volume ou de certification supplémentaire.
A4.4 – Organiser et documenter une vente pilote des produits PAM auprès des points de vente engagés.	Nombre de ventes pilotes réalisées et documentées auprès des points de vente partenaires. Cible : ≥ 2 ventes pilotes.	Bons de livraison, reçus de vente, factures simplifiées, fiches de suivi des ventes pilotes.	Que le pouvoir d'achat local permette l'acquisition d'un premier lot de produits PAM à petite échelle.

Cadre Logique : Projet Production et Valorisation des Plantes Aromatiques et Médicinales (Nouvelle Version)

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
	A4.5 – Évaluer la performance de la vente pilote à travers l’analyse des volumes vendus, des retours des points de vente et des enseignements commerciaux, afin d’orienter les ajustements nécessaires pour la commercialisation future.	Un rapport d’évaluation de la vente pilote Cible : 1 rapport d’évaluation complet.	Rapport d’évaluation de la vente pilote	Que les points de vente impliqués fournissent des retours fiables et complets sur les performances de la vente pilote.
Composante 5 – Dispositif de gouvernance, de suivi-évaluation et de pérennisation de la filière PVPAM.				
A5.1 – Mettre en place les instances de gouvernance (COPIL, CCT)	- Existence formelle d’un Comité de pilotage (COPIL) et d’un Comité consultatif technique (CCT) constitués et validés au plus tard au mois 3 du projet. - Nombre de membres officiellement désignés représentant HAF, INDH, Commune, porteuse de projet et femmes leaders. Cible : ≥ 6 membres dont ≥ 3 femmes leaders.	- Décision/lettre de création du COPIL et du CCT. - Listes de membres signées et archivées. - Règlements internes des instances (mandats, règles de fonctionnement, calendrier des réunions).	- Que les bailleurs (HAF, INDH) et la Commune acceptent de nommer des représentants disponibles. - Que les femmes leaders identifiées soient disposées à siéger dans les instances de gouvernance.	
A5.2 – Assurer le fonctionnement régulier et inclusif des instances (COPIL/CCT)	- Nombre de réunions tenues par rapport au nombre de réunions prévues sur l’année. Cible : ≥ 4 réunions de COPIL et ≥ 6 réunions de CCT tenues. - Taux moyen de participation des membres aux réunions. Cible : ≥ 70 % de participation.	- Ordres du jour et convocations envoyées. - Procès-verbaux de réunions COPIL/CCT signés. - Listes de présence archivées.	- Que les membres des instances restent engagés et disponibles malgré leurs autres responsabilités. - Qu’aucune contrainte majeure (sanitaire, climatique, politique) ne perturbe durablement la tenue des réunions.	
A5.3 – Mettre en œuvre le Cadre de Mesure du Rendement (CMR)	- Nombre de personnes formées aux outils de suivi-évaluation. Cible : ≥ 8 personnes formées. - Proportion d’indicateurs du CMR renseignés de manière complète à chaque trimestre. Cible : ≥ 90 % des indicateurs renseignés.	- Programmes et feuilles de présence des sessions de formation S&E. - Version validée du CMR. - Tableaux de bord trimestriels (base de données, fichiers Excel, registres de suivi).	- Que l’équipe projet et les femmes leaders disposent du niveau minimal de littératie requis pour utiliser des outils simplifiés de S&E. - Que les données de terrain (production, ventes, participation) soient collectées régulièrement par les équipes opérationnelles.	
A5.4 – Produire les rapports de suivi et de capitalisation	- Nombre de rapports de suivi périodiques produits et validés (techniques et financiers). Cible : au moins 3 rapports intermédiaires + 1 rapport final. - Nombre de partenaires ayant reçu les rapports . Cible : ≥ 3 partenaires destinataires.	- Rapports de suivi trimestriels et rapport final de projet. - Preuves d’envoi/partage des rapports (courriels, accusés de réception, comptes rendus de réunion).	- Que l’équipe projet respecte les échéances de reporting exigées par les bailleurs. - Que les partenaires lisent les rapports et fournissent des retours utiles pour la capitalisation.	
A5.5 – Élaborer le plan de pérennisation de la filière PAM	- Existence d’un plan de pérennisation triennal de la filière PAM, validé par le COPIL et co-construit avec les bénéficiaires. Cible : 1 plan adopté avant la fin du projet. - Nombre de démarches administratives et partenariales engagées pour la pérennisation . Cible : ≥ 3 démarches documentées.	- Plan de pérennisation écrit (document de projet, feuille de route 3 ans). - Procès-verbal de réunion COPIL validant le plan. - Dossiers administratifs déposés (statuts de coopérative, demandes d’agrément, dossiers de financement), correspondances avec partenaires.	- Que les autorités compétentes (INDH, services de la coopération, administrations sectorielles) soient disposées à accompagner la formalisation de la filière. - Que les femmes bénéficiaires souhaitent s’engager à long terme dans la gestion collective (coopérative, groupement, etc.). - Que des opportunités de financement et de partenariats complémentaires existent au-delà de la période de subvention initiale.	

4. Analyse des risques anticipés :

Hypothèses de risque et sévérité	Période probable d'occurrence	Moyen de détection	Responsable de la détection	Mesure préventive (MP)	Mesure d'atténuation (MA)	Responsable MA	Mesure de suivi
1) Les politiques publiques de soutien à l'emploi rural/valorisation des PAM sont maintenues. (Risque modéré)	Tout au long (surtout M1–M4 pour ancrage institutionnel)	Veille décisions/notes locales, retours INDH/Commune en réunions	porteuse de projet et Responsable Suivi-Evaluation (S&E)	MP : aligner le narratif et les livrables sur priorités INDH ; formaliser points de suivi institutionnels	MA : réajuster activités/partenariats (autres financeurs/acteurs locaux), repenser certaines actions	porteuse de projet et Responsable partenariats HAF	Registre des échanges, CR réunions, revue trimestrielle des parties prenantes
2) Les conditions climatiques au Maroc restent globalement favorables. (Risque élevé)	Périodes agricoles (plantation–croissance–récolte)	Alertes météo, observation stress hydrique/plantes	Responsable de production agricole et Responsable S&E	MP : calendrier cultural adapté, espèces résilientes, paillage, irrigation raisonnée	MA : replanification des cycles, replantation ciblée, sécurisation matière première alternative locale (si besoin pour maintenir transformation)	Coordinateur technique Production & Transformation	Journal agronomique hebdo et indicateurs pertes/rendements
3) Les bénéficiaires restent engagées tout au long du projet. (Risque élevé)	Tout au long (pics : récoltes, périodes sociales)	Taux d'assiduité, abandons, retours qualitatifs	Experte Genre Inclusion & Mobilisation communautaire et Responsable S&E	MP : sélection rigoureuse et charte d'engagement et communication familles et tutorat pair-à-pair	MA : visites ciblées, médiation Commune, remplacement via liste d'attente	porteuse de projet	Tableau mensuel rétention/assiduité et registre doléances
4) Les ressources hydriques sont suffisantes pour la production. (Risque élevé)	Saison d'irrigation (M2–M10)	Suivi niveau puits, débit goutte-à-goutte, pannes pompe	Responsable de production agricole	MP : plan de maintenance, budget pièces, suivi consommation, réduction pertes (fuites)	MA : réparation urgente / pompe de secours, adaptation surfaces irriguées, appui Commune pour solution temporaire	Coordinateur technique Production & Transformation et RAF	Log eau (niveau/consommation) hebdo et incidents techniques
5) Les circuits de commercialisation locaux restent accessibles. (Risque modéré)	M6–M12 (prospection/vente pilote)	Difficultés transport/accès, indisponibilité points de vente	Responsable Commercialisation & Prospection	MP : diversifier canaux (local et Marrakech via réseau), plan de transport, RDV planifiés	MA : basculer vers vente directe/foires/commande groupée, élargir portefeuille points de vente	Responsable Commercialisation & Prospection	Pipeline commercial mensuel et suivi coûts logistiques
6) Les bénéficiaires sont disponibles et assidues aux formations. (Risque modéré)	M1–M4 puis rappels	Feuilles de présence, tests simples, observation pratique	Responsable S&E	MP : planning co-construit, supports visuels, sessions courtes et pratiques	MA : sessions de rattrapage, coaching en petits groupes	Experte Genre Inclusion & Mobilisation communautaire	Tableau compétences (pré/post) et assiduité par module
7) Les familles et la communauté soutiennent la participation des bénéficiaires. (Risque modéré–élevé)	M0–M3 (mobilisation) puis épisodes ponctuels	Retours terrain, tensions signalées, baisse présence	Experte Genre Inclusion & Mobilisation communautaire	MP : réunions communautaires, messages sur bénéfices, implication leaders locaux	MA : médiation (Commune/autorités), ajustement horaires/organisation	représentant(e) de la commune et porteuse de projet	Registre doléances et compte rendu médiations
8) Les conditions climatiques sont favorables aux formations pratiques. (Risque faible–modéré)	Durant sessions terrain	Prévisions météo, impossibilité terrain	Responsable S&E	MP : prévoir alternatives indoor et flexibilité calendrier	MA : replanifier, utiliser parcelle démo/zone abritée	porteuse de projet	Suivi écarts planning formation
9) Les ressources en eau du puits sont suffisantes pour l'irrigation. (Risque élevé)	Irrigation (M2–M10)	Niveau statique/dynamique, débit, pannes	Responsable de production agricole	MP : contrôle périodique, maintenance pompe, optimisation goutte-à-goutte	MA : réparation/ remplacement pompe, solution temporaire (stockage/approvisionnement ponctuel)	RAF et Coordinateur technique Production & Transformation	Journal technique puits et temps d'arrêt irrigation
10) Le climat local est compatible avec l'établissement des cultures. (Risque modéré)	M1–M6 (implantation)	Taux de reprise, maladies/ravageurs	Responsable de production agricole	MP : espèces adaptées et densités/itinéraires ajustés et biocontrôle	MA : re-semis/replantation, adaptation espèces/rotation	RAF et Coordinateur technique Production & Transformation	Fiches parcelles et taux de pertes
11) Les bénéficiaires ont le temps de réaliser l'entretien des cultures. (Risque modéré)	M2–M10	Retards tâches, parcelles mal entretenues	Responsable d'unité de transformation	MP : planning de rotation, répartition tâches, responsabilisation leaders	MA : renfort ponctuel main-d'œuvre (si budget), réaffectation équipes	porteuse de projet	Check-list hebdo entretien et présence par tâche
12) L'approvisionnement électrique est stable pour les équipements de transformation. (Risque modéré)	M5–M12 (mise en route unité)	Journal coupures, pertes de lots	Responsable d'unité de transformation	MP : stabilisateur/UPS, planifier production heures stables	MA : groupe électrogène/solution solaire d'appoint, replanification production	RAF et Responsable d'unité de transformation	Suivi heures d'arrêt et incidents qualité
13) Les conditions climatiques/environnementales locales ne compromettent pas les équipements. (Risque modéré)	M5–M12	Surchauffe, poussière, pannes récurrentes	Responsable d'unité de transformation	MP : ventilation, protection poussière, procédures entretien	MA : maintenance corrective rapide, remplacement pièces, arrêt sécurisé	RAF et Coordinateur technique Production & Transformation	Carnet maintenance et fréquence pannes
14) La communauté soutient l'installation et l'utilisation de l'unité. (Risque modéré)	M3–M6 (installation) puis exploitation	Retours communauté, blocages site/usage	Experte Genre Inclusion & Mobilisation communautaire	MP : concertation, transparence critères accès, communication bénéfices	MA : médiation, ajustement règles d'accès, relocalisation si nécessaire	représentant(e) de la commune et porteuse de projet	Registre incidents sociaux et décisions COPIL

Hypothèses de risque et sévérité	Période probable d'occurrence	Moyen de détection	Responsable de la détection	Mesure préventive (MP)	Mesure d'atténuation (MA)	Responsable MA	Mesure de suivi
15) Les points de vente acceptent de tester les produits et montrent un intérêt minimal. (Risque modéré)	M6–M12	Refus/retours négatifs, absence commandes	Responsable Commercialisation & Prospection	MP : échantillonnage, branding, qualité constante, ciblage adapté	MA : ajuster gamme/prix/packaging, cibler nouveaux segments (hôtels/spas)	Responsable Commercialisation & Prospection et Responsable Qualité & Hygiène	Suivi retours clients et taux conversion
16) Les points de vente sont accessibles durant la prospection. (Risque faible–modéré)	M6–M9	RDV annulés, accès difficile	Responsable Commercialisation & Prospection	MP : RDV planifiés, appui introductions HAF, itinéraires optimisés	MA : élargir liste points de vente, prospection digitale/téléphonique	Responsable Commercialisation & Prospection	Pipeline et taux RDV réalisés
17) Le pouvoir d'achat local permet l'acquisition du premier lot. (Risque modéré)	M8–M12	Faible rotation stocks, retours prix	Responsable Commercialisation & Prospection	MP : formats petits/prix accessibles et B2B (hôtels/spas)	MA : basculer vers marchés à plus forte capacité (Marrakech), vente en ligne/foires	Responsable Commercialisation & Prospection	Suivi stocks et marge/rotation
18) Les membres de la gouvernance (COPIL/relai bénéficiaires) sont disponibles et engagés. (Risque modéré)	Tout au long	Quorum réunions, retards décisions	porteuse du projet	MP : calendrier COPIL, rôles clairs, PV et responsabilisation 7 leaders	MA : rotation des rôles, appui facilitation HAF	porteuse de projet et Représentant(e) HAF	Taux réunions tenues et suivi actions COPIL
19) Le cadre réglementaire/socio-éco permet la formalisation et l'accès à financements complémentaires après la subvention. (Risque modéré)	M8–M12 (pré-coop)	Retards administratifs, blocages statuts	Responsable administratif et financier (RAF)	MP : démarrer démarches tôt, appui juridique, check-list conformité	MA : modèle transitoire (association), recherche financements relais	porteuse de projet et Représentant(e) HAF	Suivi jalons formalisation et dossiers soumis
20) La communauté est disponible pour le processus de sélection permettant d'identifier 7 femmes leaders. (Risque modéré)	M0–M2	Faible participation aux réunions de sélection	Experte Genre Inclusion & Mobilisation communautaire	MP : mobilisation locale, critères transparents, sessions d'info	MA : élargir zone de recrutement, prolonger période sélection	représentant(e) de la commune et porteuse de projet	Taux candidatures et diversité profils
21) Les intervenants techniques externes sont disponibles régulièrement. (Risque faible–modéré)	M1–M6 puis ponctuel	Annulations, retards SOP/formation	Représentant(e) HAF et porteuse du projet	MP : planification anticipée, pool d'experts de réserve	MA : sessions à distance, recours à experts locaux alternatifs	Coordinateur technique Production & Transformation	Suivi calendrier intervenants et taux sessions tenues

Ce tableau synthétise les principaux risques anticipés pour le projet PVPAM, regroupés en quelques grandes familles plutôt qu'en une liste détaillée de micro-risques. Il précise, pour chacun, le moment où il est le plus susceptible de se manifester, la façon dont l'équipe pourra le détecter, ainsi que les mesures préventives et d'atténuation prévues. L'objectif est double : garder une lecture claire et opérationnelle pour la direction du projet, tout en montrant que les enjeux critiques, climat, eau, engagement des femmes, fonctionnement des équipements, gouvernance et accès au marché ont été pensés dès la phase de planification.

5. L'analyse de la faisabilité et rythme d'introduction du changement :

5.1 Faisabilité technique :

Le projet est techniquement réaliste car il articule une production agroécologique adaptée au contexte semi-aride de Rhamna et une unité de transformation correctement dimensionnée, avec une exigence centrale : la standardisation des procédés selon les normes ONSSA. Au niveau agricole, l'approche repose sur une irrigation raisonnée (goutte-à-goutte alimenté par un puits existant), une fertilisation organique, des pratiques d'entretien agroécologique et une protection phytosanitaire par biocontrôle, via des biopréparations locales (piment/ail). Au niveau industriel, l'unité de valorisation est conçue pour absorber la production des 5 hectares grâce à des équipements adaptés et appropriables par les bénéficiaires. La faisabilité dépend moins de l'acquisition du matériel que de la capacité à stabiliser la qualité dans le temps, à travers des SOP couvrant l'ensemble du processus, une traçabilité rigoureuse et une maintenance de base. Ces conditions sont directement alignées avec les activités du cadre logique : formations pratiques "learning by doing", tutorat pair-à-pair, mise en route contrôlée, tests techniques, protocole de maintenance, registres d'hygiène et de traçabilité, et préparation progressive à l'audit.

5.2 Faisabilité logistique :

La faisabilité logistique du projet repose sur une localisation stratégique pour la production et l'accès aux débouchés locaux. L'adoption des circuits courts et de la transformation sur place réduit significativement les pertes post-récolte et les coûts de transport. Cela est garanti par une structuration opérationnelle stricte de l'équipe et l'utilisation d'outils de suivi simples (registres) pour gérer les flux (stockage, conditionnement et livraison). Les mesures concrètes intégrées dans le plan d'activité incluent la planification des récoltes/séchage, le plan d'approvisionnement, et les procédures de stockage et de livraison.

5.3 Faisabilité légale et réglementaire :

La faisabilité réglementaire est critique pour l'accès aux marchés (alimentaire et cosmétique) et exige la conformité sanitaire. Le projet vise à transformer la conformité en levier de crédibilité en impliquant l'ONSSA dès le début. La stratégie inclut la mise en œuvre de SOP, la traçabilité, la formation hygiène-qualité, et la réalisation de pré-audits pour préparer la certification.

5.4 Faisabilité sociale et culturelle :

La faisabilité sociale et culturelle est centrale puisque le projet cible 20 femmes (dont 7 leaders) dans un contexte rural où l'engagement économique féminin peut rencontrer des contraintes (normes sociales, charge domestique, faible alphabétisation). Le PVPAM limite ces risques par une stratégie inclusive : mobilisation communautaire, supports visuels simplifiés, apprentissage par la pratique, et tutorat pair-à-pair favorisant la cohésion et la montée en compétences. La gouvernance participative est un déterminant de faisabilité : l'identification de 7 leaders dès la phase initiale permet de créer des relais, d'anticiper les enjeux de leadership local et de réduire la dépendance à la porteuse du projet. Les mesures spécifiques incluent des réunions adaptées, des mécanismes de feedback collectif, et l'élaboration de règles de fonctionnement simples.

5.5 Faisabilité financière et matérielle :

La faisabilité financière s'appuie sur deux étapes : un investissement initial (aménagement, équipements, démarrage) puis une consolidation par les ventes grâce à la transformation locale à valeur ajoutée. La prospection et les ventes pilotes sont donc centrales : elles évitent de produire "à l'aveugle" et permettent d'ajuster rapidement qualité, formats et prix. Pour couvrir les coûts récurrents (maintenance, consommables, emballages, transport, contrôle qualité), le projet met en place un mécanisme simple et traçable : réinvestissement d'une part des revenus, fonds de maintenance, et suivi des coûts unitaires / fonds de roulement, avec un contrôle de gestion assuré par la HAF et un reporting périodique.

5.6 Faisabilité environnementale :

La faisabilité environnementale est cohérente avec la finalité du projet : agroécologie, réduction d'intrants chimiques, irrigation raisonnée, technologies sobres (séchoir thermique/solaire, irrigation solaire). Les points de vigilance concernent surtout l'eau et les aléas climatiques, ce qui justifie l'intégration de mesures d'adaptation : optimisation de l'irrigation, diversification des espèces, suivi agronomique et ajustement des calendriers culturels.

5.7 Faisabilité organisationnelle et rythme d'introduction du changement :

La faisabilité organisationnelle du PVPAM repose sur une coordination solide entre production, transformation, hygiène-qualité, logistique et commercialisation. Elle est sécurisée par une gouvernance à trois niveaux (stratégique, exécutif, opérationnel), une répartition claire des rôles et un suivi-évaluation régulier pour ajuster rapidement.

Le changement est introduit progressivement : mobilisation et clarification des rôles, premiers résultats rapides (lots tests), standardisation (SOP, traçabilité, hygiène-qualité), puis transfert des responsabilités vers les bénéficiaires. Cette démarche limite les résistances et garantit l'atteinte des résultats du cadre logique : compétences maîtrisées, unité opérationnelle et ventes pilotes documentées.

6. Gestion des parties prenantes :

La réussite du projet PVPAM repose sur un réseau limité mais bien identifié d'acteurs qui n'ont ni le même pouvoir, ni les mêmes attentes. La gestion des parties prenantes vise ici à clarifier ces rôles et à organiser le dialogue entre le niveau stratégique (Comité de pilotage), le niveau exécutif (direction PVPAM et responsables de composantes) et les acteurs externes clés : bailleurs, autorités locales, services techniques, partenaires commerciaux et communauté de Had Hrara. L'analyse s'appuie à la fois sur le diagnostic de terrain, et la construction progressive de la gouvernance du projet. Le tableau ci-après synthétise, pour chaque partie prenante, le besoin précis du projet, son influence probable et la stratégie retenue pour l'impliquer de manière concrète dans la mise en œuvre :

Identification de la partie prenante	Besoin clé du projet que peut satisfaire la partie prenante	Niveau d'influence et comportement probable sur le projet	Stratégie du projet à l'égard de la gestion de la partie prenante
High Atlas Foundation (HAF) ; bailleur principal et partenaire technique	Apporter le financement principal (100 000 MAD) et l'ingénierie de formation / appui technique nécessaires pour structurer la filière PAM (parcelle, unité de transformation, accompagnement des femmes).	Influence élevée. Comportement probable : soutien actif si la reddition de comptes est rigoureuse, si les résultats en termes d'autonomisation des femmes et de durabilité environnementale sont visibles.	Intégrer HAF au Comité de pilotage (niveau stratégique) et lui transmettre des rapports narratifs et financiers trimestriels. L'impliquer dans la validation du calendrier de mise en œuvre, du Cadre de Mesure du Rendement et des principales décisions techniques (choix des équipements, ajustement des formations).
INDH ; Division de l'Action économique (co-bailleur)	Cofinancer (20 000 DH) les volets certification, accès au marché et gouvernance, et assurer l'alignement du projet avec la stratégie provinciale d'inclusion économique des femmes et des jeunes	Influence élevée au niveau provincial. Comportement probable : favorable, à condition que le projet cible bien les publics prioritaires INDH et respecte leurs procédures administratives.	Prévoir un siège INDH au Comité de pilotage. Co-construire le plan de certification et de commercialisation (extrait 400) et aligner certains indicateurs du CMR sur les indicateurs de performance INDH. Associer l'INDH aux visites de terrain et à l'évaluation de la vente pilote.
Commune rurale de Had Hrara / Commune de Rhamna	Fournir reconnaissance institutionnelle locale, appui logistique (salles, facilitation d'accès au site, relais avec les services techniques) et contribution financière (5 000 MAD) favorisant l'ancrage territorial du projet.	Influence élevée au niveau local. Comportement probable : soutien fort si le projet est perçu comme créateur d'emplois et compatible avec les priorités du Plan de Développement Communal ; risque de réticence si des tensions apparaissent sur l'usage de l'eau ou des terres.	Assurer une représentation officielle de la Commune au Comité de pilotage. L'impliquer dans la communication publique (lancements, visites officielles) et dans la co-élaboration du plan de pérennisation (extrait 500). Mobiliser les services communaux pour faciliter l'obtention d'autorisations et la coordination avec d'autres projets territoriaux.


Services techniques agricoles & sanitaires (DPA/ONSSA, conseillers agricoles)	Apporter l'expertise technique sur les itinéraires agroécologiques, la gestion de l'eau, l'hygiène et la conformité aux normes (bio, ONSSA) pour la production et la transformation.	Influence moyenne à élevée. Comportement probable : coopératif mais exigeant sur le respect des normes ; possibilité de blocage si les procédures ou règles sanitaires ne sont pas respectées.	Intégrer un(e) représentant(e) aux Comités consultatifs techniques (CCT) prévus par l'extrait 500 ; formaliser la collaboration (lettre d'engagement / protocole) ; prévoir des sessions de formation et des visites techniques régulières dans le calendrier d'activités.
Points de vente et partenaires commerciaux (herboristeries, épicerie fines, magasins bio)	Offrir des débouchés concrets pour les produits (tisanes, huiles, hydrolats), tester la pertinence commerciale de la gamme et donner un retour sur la qualité, le packaging et les prix.	Influence moyenne , mais décisive pour la viabilité économique. Comportement probable : soutien conditionnel à la régularité des volumes, à la qualité et à la fiabilité des livraisons ; retrait possible en cas d'irrégularité ou de problème de qualité.	Mener une prospection structurée de 25 points de vente, sélectionner au moins 5 partenaires prioritaires, puis conclure 2 accords de vente pilote (extrait 400). Organiser des rencontres régulières de retour d'expérience, adapter les conditionnements/prix en conséquence et envisager des actions conjointes de promotion locale si la vente pilote est concluante.
Porteuse de projet et équipe PVPAM	Porter la mise en œuvre opérationnelle du projet : coordination quotidienne, animation des 20 femmes productrices, gestion de l'unité de transformation, reporting de terrain. Garantir l'appropriation locale du projet et la continuité après la phase de financement.	Influence très élevée sur la réussite concrète du projet. Comportement très favorable mais soumis à des contraintes de charge de travail, de compétences de gestion et de négociation avec les parties externes.	Positionner la porteuse de projet comme membre du COPIL et comme Gestionnaire / Directrice de projet au niveau exécutif. Prévoir un accompagnement renforcé (formations en gestion de projet, suivi financier, négociation commerciale) et des espaces de redevabilité partagée (réunions internes régulières, bilans participatifs avec les bénéficiaires).

7. Structure de Gestion de projet :

La mise en place du projet « Production et Valorisation des Plantes Aromatiques et Médicinales » (PVPAM) s'accompagne d'une structuration organisationnelle pensée pour assurer à la fois la rigueur du pilotage, la participation progressive des bénéficiaires et la construction d'une identité associative durable au sein de la communauté de Rhamna. Étant donné que l'organisation maîtresse d'œuvre est une initiative entrepreneuriale individuelle en voie de structuration, le projet devient l'espace privilégié où s'articulent les apprentissages organisationnels, la consolidation des rôles et l'émergence d'un modèle de gouvernance adapté au contexte rural.

L'arrimage avec l'organisation porteuse repose sur une logique évolutive : au lancement, la porteuse du projet assure un leadership central, indispensable pour coordonner la complexité des activités techniques, administratives et relationnelles. Ce leadership n'est pas conçu comme permanent, mais comme la première étape d'un processus d'institutionnalisation où les bénéficiaires et les partenaires locaux gagneront progressivement en responsabilités. L'appui de la High Atlas Foundation (HAF) renforce cet arrimage en apportant une expertise organisationnelle, agronomique et financière qui permet de sécuriser la phase initiale du projet tout en évitant les dérives habituelles dans des initiatives locales émergentes. L'implication de la Commune de Rhamna dans les espaces décisionnels garantit quant à elle une reconnaissance communautaire essentielle, un accès facilité aux ressources locales et une cohérence avec les dynamiques territoriales.

Organigramme du Projet

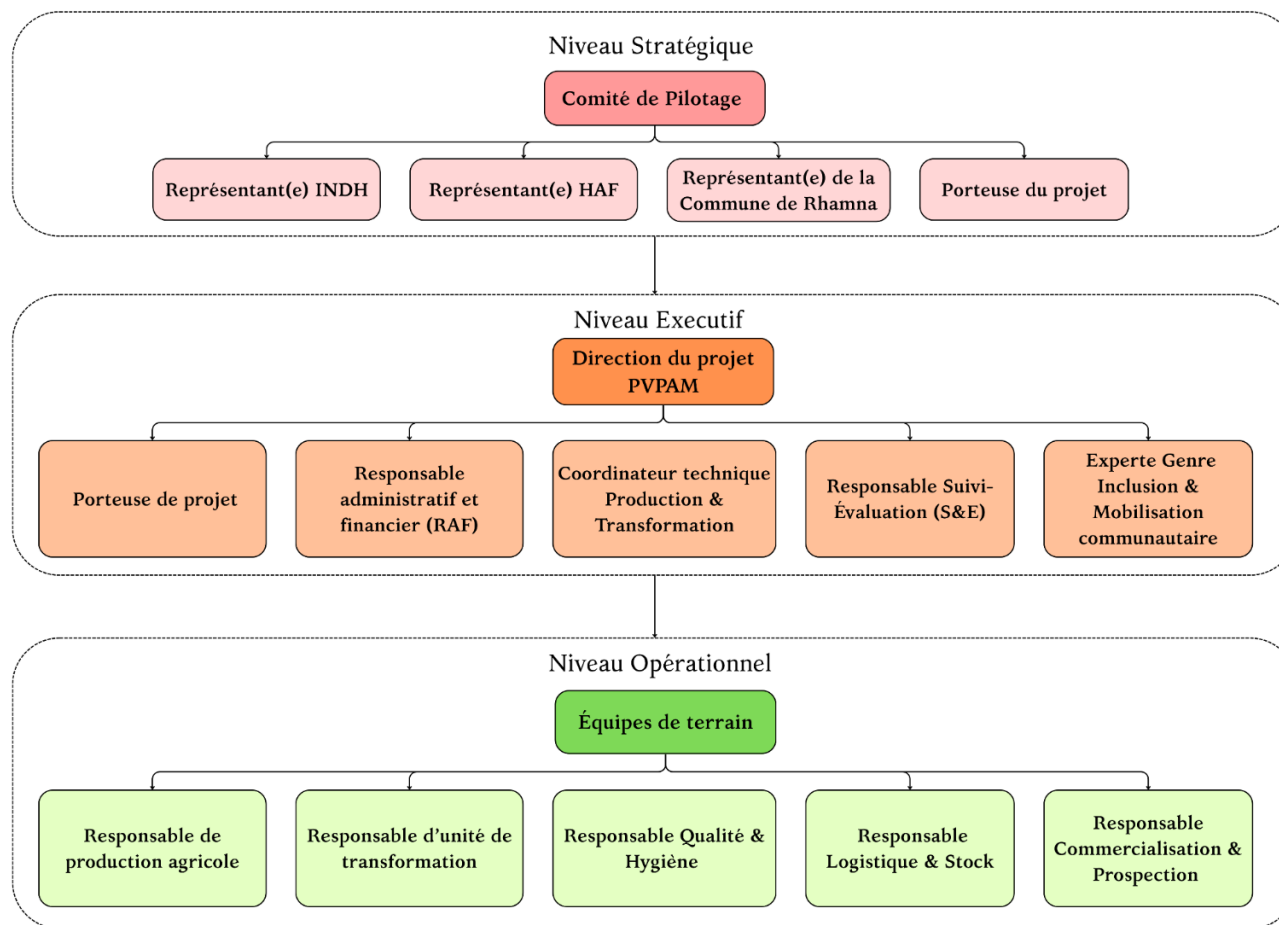

- Profil et compétences recherchés du/de la gestionnaire de projet :

La qualité de la gestion dépend fortement du profil du ou de la gestionnaire de projet. Dans le cas du PVPAM, ce rôle exige des compétences techniques et relationnelles particulières. La gestionnaire doit maîtriser les fondamentaux de la production biologique et de la transformation des PAM, comprendre les exigences de conformité ONSSA, et être capable de planifier et coordonner des activités variées. Elle doit également posséder des compétences organisationnelles solides en gestion d'équipe, communication interculturelle, planification opérationnelle, tenue de registres, gestion des risques, animation et mobilisation communautaire. De plus vu que le projet vise l'autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes, la gestionnaire doit aussi démontrer, une sensibilité sociale affirmée, une capacité d'écoute, un leadership collaboratif, et une aptitude à accompagner des processus d'autonomisation. Ces compétences sont essentielles pour transformer un projet pilote en véritable initiative structurante pour la communauté.

- Profils et compétences recherchées des membres de l'équipe du projet :

Les membres de l'équipe doivent eux aussi présenter des compétences adaptées à leurs fonctions spécifiques, mais également une aptitude à apprendre, collaborer et contribuer activement à la dynamique collective.

- L'équipe agricole doit disposer d'aptitudes pratiques liées aux travaux de terre, à l'irrigation raisonnée, au respect strict des règles de l'agroécologie et à l'entretien régulier des plantes.
- Les opérateurs de l'unité de transformation doivent être capables d'utiliser le matériel (séchoir, broyeur, extracteur), d'appliquer des protocoles d'hygiène-qualité, de manipuler les produits finis et de tenir des registres simples de traçabilité.
- L'équipe logistique et commerciale doit démontrer des compétences en communication, un sens de l'organisation, une capacité à interagir avec les points de vente, ainsi qu'une aisance dans la présentation des produits aux clients.

De manière générale, les membres doivent faire preuve de motivation, d'assiduité, d'esprit d'équipe et de volonté d'apprentissage : ces critères sont essentiels dans un projet qui vise la montée en compétences, l'autonomisation et la création d'une structure coopérative durable.

- Stratégie de communication du projet :

La stratégie de communication joue un rôle essentiel dans la réussite du projet, car elle permet de maintenir la cohésion interne, de renforcer la transparence, d'accompagner la montée en compétence des bénéficiaires et de susciter l'adhésion continu de la communauté. Dans un contexte rural tel que Rhamna, où les niveaux d'alphabétisation peuvent être faibles et où les dynamiques sociales reposent largement sur les interactions directes, la communication ne peut être envisagée comme un simple outil d'information, elle constitue une véritable stratégie de gestion du changement.

Dès le lancement du projet, la communication interne s'organise autour de moments réguliers d'échange et de coordination. La direction de projet anime des réunions hebdomadaires avec les équipes opérationnelles afin de clarifier les tâches, résoudre les difficultés techniques et renforcer la compréhension collective des itinéraires culturels et des exigences de qualité. Ces réunions permettent non seulement de fluidifier le travail, mais aussi d'instaurer une culture de collaboration et d'apprentissage continu. Elles sont complétées par des rencontres mensuelles réunissant la direction, le comité consultatif technique et les relais communautaires, afin d'assurer un suivi transversal des avancements, des retards éventuels et des ajustements nécessaires. Afin de rendre l'information accessible à tous les bénéficiaires, la communication s'appuie sur des supports pédagogiques simplifiés, souvent visuels, qui facilitent la compréhension des processus techniques (sécher, trier, extraire, conditionner), des pratiques d'hygiène-qualité ou des étapes administratives. Ces outils permettent aux personnes ayant un faible niveau de lecture d'intégrer pleinement les pratiques exigées par la transformation biologique, tout en les valorisant comme acteurs compétents du projet. La communication externe vise quant à elle à renforcer l'ancrage institutionnel et commercial du projet.

La relation régulière avec la Commune de Rhamna, formalisée à travers des réunions ponctuelles et des points d'avancement partagés, consolide la légitimité du projet au niveau local et facilite l'accès à certaines ressources (espaces, infrastructures, autorisations). La communication avec la High Atlas Foundation se matérialise par des rapports d'avancement, des comptes rendus financiers et des échanges continus avec les experts techniques ; elle est essentielle pour maintenir la confiance du partenaire, garantir la conformité aux exigences du bailleur et préparer les étapes de montée en échelle.

Sur le volet commercial, elle s'appuie sur une approche progressive : participation à des foires locales, rencontres personnalisées avec des points de vente (herboristeries, hôtels, spas), distribution d'échantillons et mise en avant de l'identité « bio-local ». Cette identité constitue un élément central de la communication, elle renforce la différenciation des produits, valorise les savoir-faire locaux et contribue à créer un sentiment d'appartenance des bénéficiaires, qui deviennent eux-mêmes ambassadeurs du projet.

Enfin, la stratégie de communication vise également à prévenir les résistances au changement et à renforcer l'adhésion de la communauté. Maintenir un dialogue constant avec les familles des bénéficiaires, clarifier les attentes, valoriser les réussites et offrir un espace d'expression et de rétroaction, le projet construit ainsi une dynamique collective durable. Cette transparence réduit les risques de malentendus, renforce la confiance et facilite les ajustements nécessaires à mesure que le projet évolue vers une gouvernance associative.

Ainsi, la stratégie de communication n'est pas un élément parallèle à la gestion, mais elle en constitue un pilier. Elle permet d'articuler les différents niveaux de gestion, d'assurer la fluidité des interactions, de soutenir l'autonomisation des bénéficiaires et de préparer l'intégration du projet dans l'écosystème socioéconomique local. En cela, elle contribue directement à la durabilité et à l'appropriation communautaire du PVPAM.


8. Planification du projet :

8.1. Planification de la Dimension technique :

8.1.1 Structure de Fractionnement du Travail :

Ce schéma présente la logique d'intervention complète du projet PVPAM, depuis l'objectif global jusqu'aux extrants opérationnels, en mettant en évidence l'enchaînement cohérent entre objectifs, composantes, activités et tâches. Il traduit visuellement la logique verticale du cadre logique, contribution à l'impact, atteinte de l'objectif spécifique, production des extrants ainsi que la logique horizontale reliant chaque extrant aux activités concrètes prévues sur la période de mise en œuvre. Cet outil permet de comprendre, d'un seul regard, comment les actions prévues s'articulent entre renforcement des capacités, production agroécologique, transformation, commercialisation et gouvernance, conformément aux exigences méthodologiques du manuel.

Structure de Fractionnement du Travail

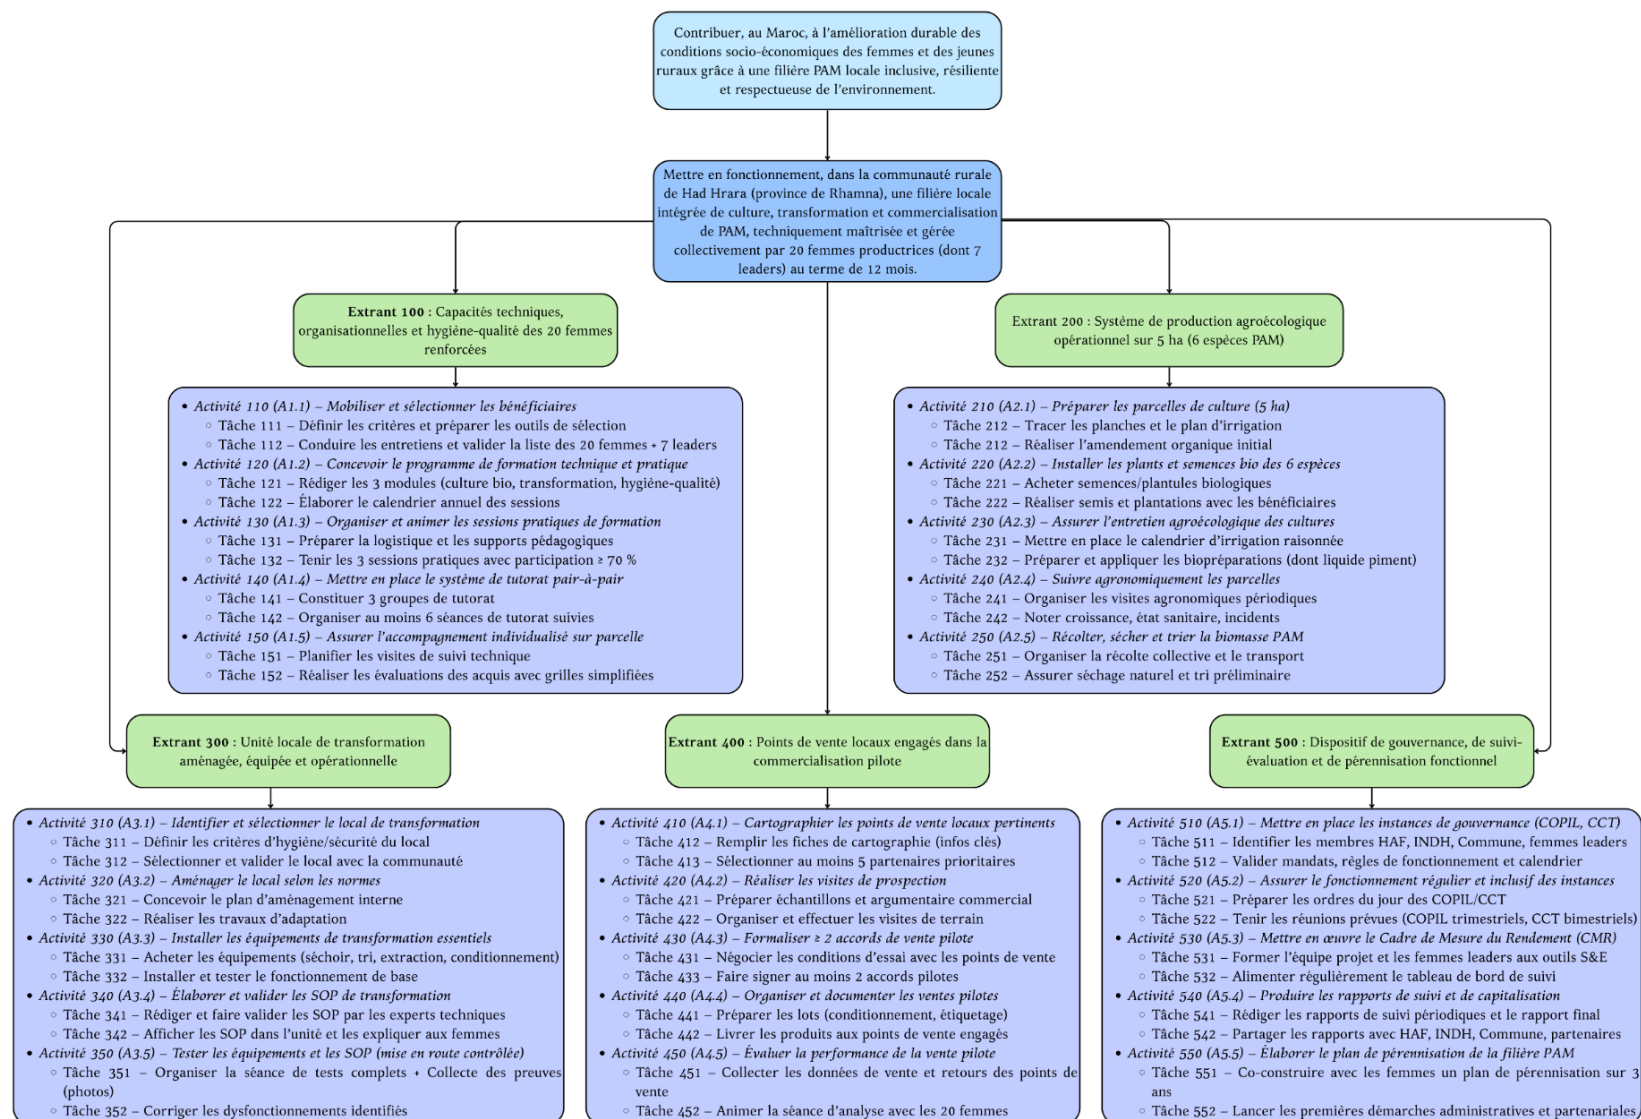

8.1.2 Tableau d'affectation des ressources :

Le tableau d'affectation des ressources présente la répartition des responsabilités humaines du projet PVPAM entre les différents extrants et activités clés. Élaboré à partir de l'organigramme du projet, il permet de visualiser clairement qui intervient à chaque étape de la mise en œuvre, depuis la coordination globale jusqu'aux actions opérationnelles sur le terrain. Cet outil vise à garantir la cohérence entre le cadre logique, la structure de gestion et les capacités réelles de l'équipe à conduire le projet dans de bonnes conditions.

Effet / Extrant / Activité clé	Porteuse de projet	RAF	Coord. technique Production & Transformation	Resp. S&E	Experte Genre & Mobilisation	Resp. production agricole	Resp. unité de transformation	Resp. Qualité & Hygiène	Resp. Logistique & Stock	Resp. Commercialisation & Prospection
Projet PVPAM (coordination globale)	✓	✓	✓	✓	✓					
Extrant 100 – Renforcement des capacités	✓		✓	✓	✓	✓		✓		
Activités 110–150 (sélection, formation, tutorat, accompagnement)	✓		✓	✓	✓	✓		✓		
Extrant 200 – Production agroécologique (5 ha)	✓		✓	✓		✓			✓	
Activités 210–250 (préparation, plantation, entretien, récolte)	✓		✓	✓		✓			✓	
Extrant 300 – Unité de transformation opérationnelle	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	


Effet / Extrant / Activité clé	Porteuse de projet	RAF	Coord. technique Production & Transformation	Resp. S&E	Experte Genre & Mobilisation	Resp. production agricole	Resp. unité de transformation	Resp. Qualité & Hygiène	Resp. Logistique & Stock	Resp. Commercialisation & Prospection
Activités 310–350 (aménagement, équipements, SOP, tests)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
Extrant 400 – Commercialisation pilote	✓		✓	✓				✓	✓	✓
Activités 410–450 (prospection, accords, ventes pilotes, évaluation)	✓		✓	✓				✓	✓	✓
Extrant 500 – Gouvernance, S&E, pérennisation	✓	✓	✓	✓	✓					
Activités 510–550 (COFIL, CMR, reporting, pérennisation)	✓	✓	✓	✓	✓					

8.2. Planification de la Dimension temps : (Diagramme Gantt) :

Le digramme ci-dessous présente la planification globale du projet PVPAM sur une durée de douze mois, allant de janvier à décembre. Il permet de visualiser l'enchaînement et le chevauchement des activités par extrant, depuis la mobilisation des bénéficiaires et la mise en place de la production jusqu'à la transformation, la commercialisation pilote et les actions transversales de gouvernance et de suivi-évaluation.


EXTRANT 100 – CAPACITES DES BENEFICIAIRES

- 110.Mobiliser et sélectionner les 20 bénéficiaires (dont 7 leaders)
- 120.Concevoir un programme de formation technique et pratique
- 130.Organiser et animer des sessions pratiques de formation
- 140.Mettre en place et accompagner un système de tutorat pair-à-pair
- 150.Assurer un accompagnement individualisé sur parcelle




EXTRANT 200 – PRODUCTION BIOLOGIQUE (5 HA)

- 210.Préparer les parcelles de culture
- 220.Installer les plants et semences biologiques sur les parcelles
- 230.Réaliser l'entretien agroécologique des cultures
- 240.Assurer un suivi agronomique régulier des cultures
- 250.Récolter, sécher et trier les PAM issues de la parcelle pilote




EXTRANT 300 – UNITÉ DE TRANSFORMATION

- 310. Identifier et choisir le local de transformation
- 320.Aménager et préparer le local retenu
- 330.Installer les équipements essentiels de transformation
- 340.Élaborer et valider les SOP de transformation
- 350.Tester les équipements et les SOP




EXTRANT 400 – DÉBOUCHÉS ET COMMERCIALISATION PILOTE

- 410.Identifier et cartographier les points de vente locaux
- 420.Réaliser des visites de prospection commerciale
- 430.Formaliser au moins deux accords de vente pilote
- 440.Organiser et documenter les ventes pilotes
- 450.Évaluer la performance de la vente pilote



EXTRANT 500 – COORDINATION, S&E, COMMUNICATION

- 510. Mettre en place les instances de gouvernance (COPIL, CCT)
- 520. Assurer le fonctionnement régulier et inclusif du COPIL/CCT
- 530 Mettre en œuvre le Cadre de Mesure du Rendement (CMR)
- 540. Produire les rapports de suivi-évaluation
- 550. Élaborer un plan de pérennisation et d’ancrage institutionnel



9. Planification de la Dimension Coût :

Les tableaux « Budget par activité » et « Budget par ressource » présentent la traduction financière de la planification technique du projet. L'ensemble des coûts directs et de gestion atteint 195 000 DH, montant identique dans les deux tableaux. Ce total inclut, en plus des dépenses financées par la HAF, l'INDH, la porteuse et la communauté, la valorisation en nature de la parcelle de 5 ha : celle-ci est comptabilisée comme un loyer fictif annuel de 50 000 DH, enregistré à la fois comme contribution de la porteuse de projet et comme poste de dépense (ligne « loyer de la parcelle – activité 210 »), afin de refléter le véritable coût économique de la mise à disposition du foncier.

9.1 Budget par activité :

Code activité	Intitulé synthétique de l'activité	Coût total (DH)
Extrant 100 – Renforcement des compétences techniques et organisationnelles		
110 (A1.1)	Mobilisation et sélection des 20 femmes bénéficiaires	3 000
120 (A1.2)	Conception du programme de formation (3 modules + calendrier)	4 000
130 (A1.3)	Sessions pratiques de formation (culture bio, séchage, transformation, hygiène)	12 000
140 (A1.4)	Système de tutorat pair-à-pair (3 groupes, 6 séances)	2 000
150 (A1.5)	Accompagnement individualisé sur parcelles (visites et évaluations d'acquis)	4 000
Sous-total Extrant 100		25 000
Extrant 200 – Mise en production biologique sur 5 ha		
210 (A2.1)	Préparation des 5 ha (nettoyage, nivellement, amendement, loyer fictif de la parcelle)	55 000

220 (A2.2)	Plantation des 6 espèces biologiques	5 000
230 (A2.3)	Entretien agroécologique (irrigation raisonnée, binage, biopréparations)	4 000
240 (A2.4)	Suivi agronomique régulier (visites d'observation et ajustements techniques)	3 000
250 (A2.5)	Récolte, séchage et tri de la biomasse	3 000
Sous-total Extrant 200		70 000
Extrant 300 – Unité locale de transformation aménagée et opérationnelle		
310 (A3.1)	Visites et choix du local de transformation	3 000
320 (A3.2)	Aménagement technique et sanitaire du local	12 000
330 (A3.3)	Acquisition et installation des équipements essentiels (séchoir, tri, stockage, conditionnement)	30 000
340 (A3.4)	Élaboration et validation des SOP (séchage, tri, extraction, conditionnement)	5 000
350 (A3.5)	Tests de mise en route contrôlée de l'unité	5 000
Sous-total Extrant 300		55 000
Extrant 400 – Développement des débouchés et vente pilote		
410 (A4.1)	Cartographie des points de vente locaux pertinents	3 000

420 (A4.2)	Visites de prospection commerciale	4 000
430 (A4.3)	Formalisation de 2 accords de vente pilote	4 000
440 (A4.4)	Organisation des ventes pilotes auprès des points de vente engagés	4 000
450 (A4.5)	Évaluation de la vente pilote (analyse des ventes et retours)	5 000
Sous-total Extrant 400		20 000
Extrant 500 – Gouvernance, suivi-évaluation et pérennisation		
510 (A5.1)	Mise en place des instances de gouvernance (COPIL, CCT)	3 000
520 (A5.2)	Fonctionnement régulier et inclusif du COPIL/CCT	3 000
530 (A5.3)	Mise en œuvre du Cadre de Mesure du Rendement (CMR)	3 000
540 (A5.4)	Rapports de suivi-évaluation et partage des résultats	3 000
550 (A5.5)	Plan de pérennisation et premières démarches institutionnelles	3 000
Sous-total Extrant 500		15 000
Sous-total activités (hors imprévus)		185 000

Imprévus (5 % du budget total)		6 750
TOTAL PROJET (budget par activité)		191 750

9.2 Budget par ressource :

Ressource	Coût total (DH)	Dont contribution en nature (DH)
Ressources humaines (salaires, honoraires, main-d'œuvre)	59 800	0
Intrants agricoles & consommables (compost, semences, biopréparations, petits matériels, PLV, consommables de test...)	12 500	0
Équipements de transformation & travaux d'aménagement (séchoir, tables inox, rayonnages, matériel de tri/conditionnement, matériaux d'aménagement du local)	36 000	0
Déplacements (transport terrain, prospection, logistique)	9 000	0
Séjours & restauration (collations formations, réunions, ateliers, restitutions)	10 600	0
Impression & documentation (supports de formation, grilles de suivi, contrats, rapports, SOP)	7 100	0

Loyer fictif de la parcelle de 5 ha	50 000	50 000
Imprévus (5 % du budget financier)	6 750	0
TOTAL PROJET	191 750	50 000

10. Stratégie de durabilité et de pérennisation du changement :

La durabilité du projet « Production et Valorisation des Plantes Aromatiques et Médicinales » (PVPAM) repose sur une démarche conçue pour assurer la continuité institutionnelle, technique, économique et sociale des actions menées, même après la fin de l'appui de la High Atlas Foundation (HAF). En effet, la stratégie de durabilité vise à maintenir les résultats obtenus, à renforcer l'autonomie des bénéficiaires et à ancrer durablement les pratiques agroécologiques et organisationnelles dans la communauté de Rhamena. Elle s'appuie également sur les enseignements sur le pilotage du changement, en mettant l'accent sur l'appropriation, la participation active des parties prenantes et l'intégration progressive du projet dans les dynamiques locales existantes.

Sur le plan institutionnel, la durabilité repose sur la création d'une gouvernance communautaire solide. Dès la première année, le projet prépare une transition vers une structure associative ou coopérative locale gérée par les bénéficiaires. Cette évolution est rendue possible grâce à la formation des leaders communautaires, à l'accompagnement offert par la direction de projet, et à la présence d'un comité de pilotage qui inclut déjà des acteurs locaux tels que la Commune de Rhamena. Cette inclusion progressive permet de transférer progressivement les responsabilités décisionnelles et garantit que la structure qui portera le projet à long terme sera ancrée dans le tissu local.

Sur le plan technique et opérationnel, la pérennité s'appuie sur le renforcement des capacités des bénéficiaires dans l'ensemble de la chaîne de valeur : culture biologique, séchage, tri, extraction, hygiène-qualité, conditionnement et commercialisation. Les compétences acquises au cours des formations, du tutorat pair-à-pair et des ateliers pratiques permettent d'assurer la continuité technique du projet, même en l'absence des experts de HAF. Le choix de techniques culturellement accessibles, de biopréparations locales (comme le liquide à base de piments) et d'équipements adaptés au contexte rural contribue également à une durabilité technique maîtrisée. Les parcelles de démonstration et l'unité de transformation constituent des infrastructures pérennes qui continueront d'être utilisées par les bénéficiaires une fois le financement terminé.

La durabilité économique repose sur la mise en place d'un modèle de production et de valorisation capable de générer des revenus réguliers à partir de filières locales. Le projet favorise un modèle à faible dépendance externe, fondé sur l'utilisation d'intrants organiques locaux, la transformation sur place et la vente directe à des points de vente proches (herboristeries, hôtels, spas, marchés). Ces choix réduisent les coûts logistiques et renforcent la résilience économique. Le développement de ventes pilotes, la consolidation de relations commerciales et l'amélioration progressive de la qualité constituent des stratégies essentielles pour sécuriser des revenus récurrents pour les bénéficiaires. À moyen terme, l'obtention de la conformité ONSSA renforce la crédibilité des produits et ouvre la porte à de nouveaux marchés.

Sur le plan social, la durabilité repose sur l'autonomisation des femmes et des jeunes, l'amélioration de leurs compétences, la participation équitable au projet et le renforcement de leur rôle décisionnel. En développant des compétences techniques, organisationnelles et entrepreneuriales, les bénéficiaires deviennent capables d'assurer eux-mêmes la production, la gestion collective et la commercialisation. Le projet instaure également une dynamique d'entraide et de solidarité au sein du groupe, renforcée par le tutorat et les responsabilités partagées. Cela favorise l'émergence d'un noyau communautaire engagé et capable de porter le changement social à long terme.

Enfin, la stratégie de durabilité est directement liée aux activités du cadre logique. Ces activités ne sont pas seulement des étapes du projet : elles constituent les conditions concrètes de la durabilité. Leur articulation structurée permet d'assurer que le projet continuera à vivre au-delà de son financement initial, porté par une communauté renforcée, une gouvernance locale consolidée et un modèle économique viable.

11. Mécanismes de suivi-évaluation (M&E) et pilotage du changement :

11.1 Modalités de suivi et de collecte des données :

Conformément à l'approche de gestion axée sur les résultats (GAR) présentée par Maltais et al. (2021), le dispositif de suivi-évaluation du PVPAM poursuit trois objectifs complémentaires : piloter la mise en œuvre, assurer une redevabilité transparente auprès des partenaires (INDH, HAF, Commune) et alimenter l'apprentissage continu pour ajuster la stratégie, notamment sur la qualité, l'organisation et la commercialisation. Il est structuré à partir des indicateurs du cadre logique et repose sur une collecte de données volontairement simple, régulière et traçable, afin de produire des informations utiles à la décision sans alourdir la mise en œuvre.

Le suivi combine un suivi opérationnel de proximité et un reporting structuré. Au niveau du terrain, chaque équipe métier (production agricole, transformation, qualité-hygiène, logistique-stock, commercialisation-prospection) renseigne des outils standardisés : registres de production, fiches de contrôle hygiène/qualité, fiches de maintenance, registres de traçabilité, journal de ventes (bons de livraison, reçus), ainsi que feuilles de présence et fiches de progression des formations. Au niveau exécutif, le/la Responsable Suivi-Évaluation (S&E) centralise mensuellement ces informations dans un tableau de bord partagé (type Excel/registre), vérifie la cohérence et la complétude des données à partir des pièces justificatives, puis prépare des synthèses lisibles. Enfin, au niveau stratégique, le reporting mensuel est discuté au Comité Consultatif Technique (CCT) afin d'arbitrer les ajustements techniques (calendrier cultural, amélioration des SOP, organisation de l'unité), et des points d'étape sont transmis au COPIL selon la fréquence convenue, au minimum lors des jalons clés. L'ensemble constitue un dispositif "léger mais robuste" : un nombre limité d'indicateurs, des preuves simples et vérifiables, et une attribution claire des responsabilités par fonction.

11.2 Cadre de mesure du rendement :

Résultats attendus	Indicateurs	Résultats de base (baseline)	Cibles (12 mois)	Sources de données	Méthodes de collecte	Fréquence	Responsabilités
Objectif global : contribution à l'amélioration des conditions socio-économiques des femmes/jeunes ruraux	(1) Taux d'emploi des femmes et des jeunes ruraux au Maroc ; (2) Indice national d'autonomisation socio-éco des femmes rurales	Valeur nationale la plus récente disponible	Suivi de tendance (niveau national)	Enquête nationale sur l'emploi (HCP) ; rapports institutionnels	Revue documentaire (pas de collecte terrain)	Semestriel	Responsable S&E (consolidation) + Direction du projet (validation)
Objectif spécifique : filière intégrée PAM fonctionnelle (culture + transformation + commercialisation), gérée collectivement	(1) % composantes opérationnelles sur 12 mois ; (2) % bénéficiaires maîtrisant les compétences nécessaires	0 (filiale non structurée au démarrage)	(1) $\geq 50\%$; (2) $\geq 70\%$	Registres mensuels d'activité filière ; rapports de coordination filière/cooperative	Compilation registres + vérification terrain + PV de réunions	Mensuel (pilotage) + Semestriel (synthèse)	Responsable S&E + Coordinateur technique Production & Transformation
Extrant 1 : compétences techniques, organisationnelles, hygiène-qualité renforcées	% bénéficiaires avec maîtrise satisfaisante (tests/évaluations)	À mesurer au démarrage (pré-test)	$\geq 70\%$ (20 participantes, dont 7 leaders)	Rapports d'évaluation des compétences ; fiches de progression	Pré/post-tests + observation pratique + feuilles de présence	Après chaque module + bilan trimestriel	Responsable S&E + Experte Genre/Inclusion & Mobilisation + formateurs
Extrant 2 : production PAM bio établie (5 ha) et pratiques agroécologiques appliquées	% parcelles conformes aux pratiques (prépa sol, fertilisation organique, irrigation raisonnée, lutte bio)	0 (parcelles PAM structurées)	$\geq 70\%$ des parcelles conformes	Fiches de suivi agroécologique ; photos datées ; journal cultural	Visites terrain + checklists + journal cultural	Mensuel (saison)	Responsable de production agricole + Coordinateur technique
Extrant 3 : unité de transformation/conditionnement opérationnelle	% opérations essentielles réalisables (séchage, tri, extraction, conditionnement)	0 (unité non équipée)	$\geq 70\%$ opérations réalisables	Rapports techniques d'installation/mise en service ; checklists tests	Tests techniques + checklists SOP + registre maintenance	Mensuel (démarrage) puis trimestriel	Responsable d'unité de transformation + Responsable Qualité & Hygiène

Résultats attendus	Indicateurs	Résultats de base (baseline)	Cibles (12 mois)	Sources de données	Méthodes de collecte	Fréquence	Responsabilités
Extrant 4 : débouchés commerciaux activés via vente pilote documentée	# points de vente ayant réalisé ≥ 1 vente pilote documentée	0	≥ 2 points de vente	Bons de livraison, reçus/factures simples ; registre ventes	Collecte pièces + registre ventes + retours clients	Mensuel	Responsable Commercialisation & Prospection + RAF (traçabilité)
Extrant 5 : gouvernance, S&E et plan de pérennisation en place	(1) # réunionsCOPIL/CCT + taux participation ; (2) Plan de pérennisation triennal validé + ≥ 3 démarches documentées	0	(1) ≥ 4 COPIL & ≥ 6 CCT, participation $\geq 70\%$; (2) plan validé + ≥ 3 démarches	PV réunions, listes de présence ; plan validé ; dossiers administratifs/partenariaux	Compilation PV + registre partagé + archivage dossiers	Mensuel (CCT) + jalons COPIL	Direction du projet + Responsable S&E + RAF

11.3 Modalités d'évaluation et Pilotage du changement :

Les modalités d'évaluation du projet PVPAM s'appuient sur une évaluation finale participative, complétée par une revue à mi-parcours, afin de soutenir à la fois la redevabilité envers les partenaires et l'apprentissage en continu. La revue à mi-parcours (M6) permet de vérifier l'avancement des extrants clés — notamment la montée en compétences des bénéficiaires, l'état d'implantation et de conduite des parcelles, ainsi que l'opérationnalisation de l'unité de transformation — et de déclencher, si nécessaire, des mesures correctives telles que le renforcement de l'encadrement/coaching, l'ajustement des procédures opérationnelles standard (SOP) ou le recalibrage de la prospection commerciale. L'évaluation finale (M12) vise à mesurer les résultats atteints, à documenter les effets socio-économiques observés et à produire des enseignements structurés pour orienter une éventuelle mise à l'échelle.

Le cadre de référence de l'évaluation s'inspire des bonnes pratiques en DIAH et des critères mobilisés par Maltais, en couvrant : (i) la pertinence (adéquation de la filière PAM/bio avec les contraintes hydriques et les besoins des femmes rurales), (ii) l'efficacité (atteinte des cibles, notamment ≥ 70 % de maîtrise des compétences, ≥ 70 % de parcelles conformes, au moins 2 ventes pilotes documentées et une gouvernance fonctionnelle), (iii) l'efficacité (cohérence entre ressources engagées et résultats obtenus : délais, coûts unitaires, pertes), (iv) les premiers signaux d'impact (évolution perçue des revenus, renforcement de la confiance/leadership, dynamique collective), et (v) la durabilité (existence d'un plan triennal, mécanismes de réinvestissement/maintenance, autonomie progressive de gestion). L'évaluation mobilisera une combinaison de méthodes : focus groups (bénéficiaires et familles), enquêtes de satisfaction, études de cas centrées sur les 7 leaders, revue documentaire (PV, registres, pièces de vente) et visites terrain. Les résultats seront restitués et discutés avec la HAF, l'INDH, la Commune et les partenaires régionaux.

En parallèle, le PVPAM intègre un dispositif explicite de pilotage du changement pour prévenir les résistances et sécuriser l'adoption des nouvelles pratiques. Le projet introduit à la fois un changement technique (agroécologie, SOP, hygiène-qualité) et un changement social/organisationnel (travail collectif, leadership féminin, relation directe au marché). L'approche retenue est progressive : elle commence par la mobilisation et la sécurisation (information des familles, clarification des rôles, identification des 7 leaders), se renforce par des résultats rapides ("quick wins") via des lots tests, démonstrations et ventes pilotes, se consolide par la standardisation (SOP, traçabilité, routines qualité-hygiène et maintenance), puis évolue vers une autonomisation progressive (transfert de responsabilités, formalisation coopérative, plan de pérennisation). Dans cette logique, le suivi-évaluation joue un rôle central : il sert de "moteur" au changement en détectant précocement les signaux faibles (absences, non-conformités, retards techniques, blocages commerciaux) et en permettant d'activer rapidement les ajustements via le CCT et le COPIL.

Références Bibliographiques :

Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). (2024). *Étude de projet : Production et valorisation des plantes aromatiques et médicinales (PAM)*. Province de Rhamna, Maroc.

Maltais, D. (2019). *Gestion de projets de développement international et d'action humanitaire*. Québec : Presses de l'Université du Québec.

Annexes :

Fiches d'activité :

FICHE ACTIVITÉ 110 (A1.1)

Extrant : 100 – Capacités techniques, organisationnelles et hygiène-qualité des 20 femmes renforcées

Activité : 110 (A1.1) – Mobiliser et sélectionner les 20 bénéficiaires (dont 7 leaders)

Livrable : 20 bénéficiaires sélectionnées pour le parcours, dont 7 femmes leaders, avec formulaires de sélection complétés

Ressources humaines : Porteuse de Projet, assistante de projet

Durée / niveau d'effort : 3 jours sur le terrain (2 jours chargée de mobilisation + 1 jour assistante)

Période : Mois 1

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Salaires / honoraires	Porteuse de Projet	2 jours	800	2 jours	1 600	0
Salaires / honoraires	Assistante de projet	1 jour	400	1 jour	400	0
Frais de déplacement	Transport local (visites communautés)	1 forfait	600	—	600	0
Frais de séjour	Collations réunions (20 pers. × 2)	40 collations	10	—	400	0
TOTAL activité 110					3 000	0

FICHE ACTIVITÉ 120 (A1.2)

Extrant : 100

Activité : 120 (A1.2) – Concevoir un programme de formation technique et pratique (culture bio, séchage, transformation, hygiène-qualité)

Livrable : 3 modules de formation rédigés et validés + calendrier des sessions

Ressources humaines : Coordinateur technique production & transformation, Responsable hygiène-qualité, coordination projet

Durée / niveau d'effort : 4 jours (3 jours d'expertise + 1 jour de coordination/validation)

Période : Mois 1–2

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Salaires / honoraires	Coordinateur technique production & transformation	2 jours	1 000	2 jours	2 000	0
Salaires / honoraires	Responsable hygiène-qualité	1 jour	1 000	1 jour	1 000	0
Salaires / honoraires	Porteuse du projet (validation)	1 jour	500	1 jour	500	0
Frais impression	Impression des supports (modules, fiches)	1 forfait	500	—	500	0
TOTAL activité 120					4 000	0

FICHE ACTIVITÉ 130 (A1.3)

Extrant : 100

Activité : 130 (A1.3) – Organiser et animer des sessions pratiques de formation (culture bio, séchage, transformation, hygiène-qualité)

Livrable : 3 sessions pratiques réalisées, avec ≥ 70 % de participation moyenne

Ressources humaines : Porteuse du projet, assistante de formation

Durée / niveau d'effort : 4 jours (1 jour préparation + 3 jours animation)

Période : Mois 3–4

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Salaires / honoraires	Porteuse du projet	3 jours	1 500	3 jours	4 500	0
Salaires / honoraires	Assistante de formation	3 jours	1 000	3 jours	3 000	0
Frais de séjour	Collations / repas (20 pers. $\times$ 3 jours)	60 « repas »	50	—	3 000	0
Frais de déplacement	Transport formateurs + matériel	3 jours	500	—	1 500	0
TOTAL activité 130					12 000	0

FICHE ACTIVITÉ 140 (A1.4)

Extrant : 100

Activité : 140 (A1.4) – Mettre en place et accompagner un système de tutorat pair-à-pair

Livrable : 3 groupes de tutorat constitués, 6 séances de tutorat réalisées

Ressources humaines : 3 femmes leaders mentors, appui coordination projet

Durée / niveau d'effort : 3 demi-journées d'accompagnement (équivalent 2 jours)

Période : Mois 5–7

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Jetons / honoraires	3 femmes leaders (mentors)	6 séances (3 groupes × 2)	250	6 demi-journées ≈ 3 jours	1 500	0
Matériel pédagogique	Fiches de suivi, carnets, stylos	1 forfait	500	—	500	0
TOTAL activité 140					2 000	0

FICHE ACTIVITÉ 150 (A1.5)

Extrant : 100

Activité : 150 (A1.5) – Assurer un accompagnement individualisé sur parcelle

Livrable : 3 sessions d'évaluation des acquis réalisées sur les parcelles des bénéficiaires

Ressources humaines : Coordinateur technique production & transformation, porteuse de projet

Durée / niveau d'effort : 3 jours de visites sur parcelle

Période : Mois 6–9

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Salaires / honoraires	Coordinateur technique production & transformation	3 jours	900	3 jours	2 700	0
Frais de déplacement	Transport vers parcelles (3 tournées)	3 jours	300	—	900	0
Frais impression	Fiches d'évaluation et grilles simplifiées	1 forfait	400	—	400	0
TOTAL activité 150					4 000	0

FICHE ACTIVITÉ 210 (A2.1)

Extrant : 200 – Système de production agroécologique opérationnel sur 5 ha (6 espèces PAM)

Activité : 210 (A2.1) – Préparer les parcelles de culture (nettoyage, nivellement, tracé des planches, amendement organique initial)

Livable : 5 ha préparés conformément aux itinéraires techniques bio (planches tracées, sol amendé, plan d'irrigation esquissé)

Ressources humaines : Coordinateur technique production & transformation, Technicien(ne) agroécologie, porteuse du projet

Durée / niveau d'effort : 10 jours de préparation sur le terrain

Période : Mois 2–3

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Salaires / main-d'œuvre	Coordinateur technique production & transformation (nettoyage, nivellement)	10 jours	200	10 jours	2 000	0
Salaires / honoraires	Technicien(ne) agroécologie (supervision)	3 jours	500	3 jours	1 500	0
Intrants / matières	Compost / amendement organique initial	1 forfait	1 500	—	1 500	0
Frais de locaux / terre	Loyer fictif parcelle 5 ha (1 an)	1 an	50 000	—	50 000	50 000
TOTAL activité 210					55 000	50 000

FICHE ACTIVITÉ 220 (A2.2)

Extrant : 200

Activité : 220 (A2.2) – Installer les plants et semences biologiques sur les parcelles préparées

Livrable : 5 ha plantés avec 6 espèces PAM (verveine, menthe, romarin, thym, moringa, etc.), densités et espacements conformes aux itinéraires techniques

Ressources humaines : Coordinateur technique production & transformation, 20 bénéficiaires, appui logistique

Durée / niveau d'effort : 3 jours de plantation collective

Période : Mois 3–4

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Intrants / matières	Semences / plantules bio (6 espèces)	1 forfait	3 000	—	3 000	0
Salaires / honoraires	Coordinateur technique production & transformation (encadrement plantation)	1 jour	700	1 jour	700	0
Jetons / collations	Collations pour 20 femmes (3 jours)	60 collations	20	—	1 200	0
Frais de déplacement	Transport outils & technicien	1 forfait	100	—	100	0
TOTAL activité 220					5 000	0

FICHE ACTIVITÉ 230 (A2.3)

Extrant : 200

Activité : 230 (A2.3) – Réaliser l’entretien agroécologique des cultures (irrigation raisonnée, binages, biopréparations)

Livrable : 6 cycles complets d’entretien réalisés (irrigations, binages, applications de biopréparations documentés)

Ressources humaines : Coordinateur technique production & transformation, bénéficiaires, appui porteuse du projet

Durée / niveau d’effort : 6 visites techniques ponctuelles sur la campagne

Période : Mois 4–10

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d’unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d’effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Salaires / honoraires	Coordinateur technique production & transformation (suivi et conseils sur place)	6 visites	300	6 demi-journées	1 800	0
Intrants / matières	Biopréparations (purin, liquide de piment, ...)	1 forfait	1 400	—	1 400	0
Intrants / petit matériel	Outils de binage, arrosoirs, tuyaux secondaires	1 forfait	800	—	800	0
TOTAL activité 230					4 000	0

FICHE ACTIVITÉ 240 (A2.4)

Extrant : 200

Activité : 240 (A2.4) – Assurer un suivi agronomique régulier des cultures (visites d’observation, relevés de croissance, ajustements techniques)

Livrable : 6 visites agronomiques documentées (grilles d’observation et recommandations conservées)

Ressources humaines : Coordinateur technique production & transformation, porteuse de projet

Durée / niveau d’effort : 6 visites sur le terrain

Période : Mois 4–10

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d’unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d’effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Salaires / honoraires	Coordinateur technique production & transformation	6 visites	250	6 demi-journées	1 500	0
Frais de déplacement	Transport vers parcelles (6 visites)	6 déplacements	200	—	1 200	0
Frais impression	Grilles d’observation et fiches de suivi	1 forfait	300	—	300	0
TOTAL activité 240					3 000	0

FICHE ACTIVITÉ 250 (A2.5)

Extrant : 200

Activité : 250 (A2.5) – Récolter, sécher et trier les PAM issues de la parcelle pilote

Livable : Volume total de biomasse récoltée, séchée et triée selon les protocoles post-récolte définis (lots prêts pour la transformation)

Ressources humaines : Bénéficiaires, Responsable d'unité de transformation

Durée / niveau d'effort : 3 jours de campagne de récolte & séchage

Période : Mois 10–12

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Salaires / jetons	Indemnités de récolte pour 20 bénéficiaires	60 « journées » (20×3)	30	60 demi-journées	1 800	0
Salaires / honoraires	Responsable d'unité de transformation (organisation séchage/tri)	2 jours	400	2 jours	800	0
Intrants / matériel	Sacs, claies de séchage, gants, petits équipements	1 forfait	400	—	400	0
TOTAL activité 250					3 000	0

FICHE ACTIVITÉ 310 (A3.1)

Extrant : 300 – Unité locale de transformation aménagée, équipée et opérationnelle

Activité : 310 (A3.1) – Identifier, aménager et équiper un local adapté pour accueillir l'unité de transformation des PAM selon les normes d'hygiène et de sécurité requises (*focus ici sur l'identification et la sélection du local*)

Livrable : Au moins 3 locaux visités et évalués avec grilles d'hygiène/sécurité, 1 local retenu pour la suite

Ressources humaines : Responsable hygiène–sécurité, Porteuse de projet

Durée / niveau d'effort : 3 jours (2 jours visites techniques + 1 jour synthèse/choix)

Période : Mois 4

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Salaires / honoraires	Responsable hygiène–sécurité	2 jours	800	2 jours	1 600	0
Salaires / honoraires	Porteuse de projet	1 jour	500	1 jour	500	0
Frais de déplacement	Transport local pour visites ($\approx$ 3 locaux)	1 forfait	700	—	700	0
Frais impression	Grilles d'évaluation et fiches de visite	1 forfait	200	—	200	0
TOTAL activité 310					3 000	0

FICHE ACTIVITÉ 320 (A3.2)

Extrant : 300

Activité : 320 (A3.2) – Aménager et préparer le local retenu conformément aux exigences techniques et sanitaires d’une unité de transformation artisanale

Livrable : Local aménagé (sols, murs, ventilation, surfaces de travail, points d’eau) conforme à la grille technique

Ressources humaines : Maçon/ouvrier polyvalent, électricien, porteuse de projet

Durée / niveau d’effort : 10 jours de travaux + 3 jours d’électricité

Période : Mois 4–5

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d’unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d’effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Main-d’œuvre travaux	Maçon / ouvrier pour adaptation du local	10 jours	400	10 jours	4 000	0
Main-d’œuvre électricité	Électricien (prises, éclairage, sécurisation)	3 jours	400	3 jours	1 200	0
Matériaux d’aménagement	Peinture, revêtements, ventilation, plomberie	1 forfait	6 000	—	6 000	0
Logistique	Transport matériaux & évacuation des gravats	1 forfait	800	—	800	0
TOTAL activité 320					12 000	0

FICHE ACTIVITÉ 330 (A3.3)

Extrant : 300

Activité : 330 (A3.3) – Installer les équipements essentiels de transformation (séchoir, matériel de tri, matériel d'extraction, matériel de conditionnement)

Livrable : Parc d'équipements installé et fonctionnel selon la liste prévue

Ressources humaines : Fournisseurs d'équipements, Coordinateur technique production & transformation, équipe projet

Durée / niveau d'effort : 1 à 2 semaines (livraison + installation + réglages)

Période : Mois 5–6

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Équipement principal	Séchoir électrique/inox	1 unité	12 000	—	12 000	0
Équipement de travail	Tables inox & plans de travail	1 lot	6 000	—	6 000	0
Équipement de stockage	Rayonnages / étagères / armoires de stockage	1 lot	4 000	—	4 000	0
Matériel de tri	Tamis, bacs, contenants pour tri et nettoyage	1 lot	3 000	—	3 000	0
Matériel de conditionnement	Scelleuse, balances, doseurs, accessoires emballage	1 lot	5 000	—	5 000	0
TOTAL activité 330					30 000	0

FICHE ACTIVITÉ 340 (A3.4)

Extrant : 300

Activité : 340 (A3.4) – Élaborer et valider les procédures opérationnelles standard (SOP) de transformation : séchage, tri, extraction, conditionnement

Livrable : 4 SOP complètes (séchage, tri, extraction, conditionnement) validées et mises en forme (fiches affichables)

Ressources humaines : Experte transformation / hygiène, porteuse de projet, participantes clés

Durée / niveau d'effort : 2 jours de rédaction + 1 jour de validation

Période : Mois 6–7

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Salaires / honoraires	Experte PAM / hygiène pour rédaction des SOP	2 jours	1 500	2 jours	3 000	0
Salaires / honoraires	Porteuse de projet (mise en forme / validation)	1 jour	500	1 jour	500	0
Frais impression	Impression & plastification des SOP & check-lists	1 forfait	1 000	—	1 000	0
Frais de séjour	Collations atelier de validation (≈ 10 participants)	10 collations	50	—	500	0
TOTAL activité 340					5 000	0

FICHE ACTIVITÉ 350 (A3.5)

Extrant : 300

Activité : 350 (A3.5) – Tester les équipements et les SOP à travers une séance de mise en route contrôlée

Livrable : 1 test fonctionnel complet par processus (4 processus testés : séchage, tri, extraction, conditionnement), avec rapports de test et photos

Ressources humaines : Coordinateur technique production & transformation, assistante de production, 20 bénéficiaires

Durée / niveau d'effort : 2 jours de tests complets

Période : Mois 7–8

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Salaires / honoraires	Coordinateur technique production & transformation (supervision mise en route)	2 jours	800	2 jours	1 600	0
Salaires / honoraires	Assistante de production	2 jours	600	2 jours	1 200	0
Intrants / matières	PAM (matière première) utilisées pour tests	1 forfait	1 200	—	1 200	0
Intrants / consommables	Sachets, étiquettes, produits de nettoyage, énergie	1 forfait	1 000	—	1 000	0
TOTAL activité 350					5 000	0

FICHE ACTIVITÉ 410 (A4.1)

Extrant : 400 – Points de vente locaux engagés dans la commercialisation pilote

Activité : 410 (A4.1) – Identifier et cartographier les points de vente locaux pertinents

Livrable : Fiche de cartographie de jusqu'à 25 points de vente (localisation, contact, type d'établissement)

Ressources humaines : Responsable de prospection, assistante de projet

Durée / niveau d'effort : 3 jours (terrain + saisie)

Période : Mois 7

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Salaires / honoraires	Responsable de prospection	2 jours	800	2 jours	1 600	0
Salaires / honoraires	Assistante de projet (saisie fiches)	1 jour	400	1 jour	400	0
Frais de déplacement	Transport pour visites de points de vente	1 forfait	600	—	600	0
Frais impression	Impression fiches de cartographie & cartes	1 forfait	400	—	400	0
TOTAL activité 410					3 000	0

FICHE ACTIVITÉ 420 (A4.2)

Extrant : 400

Activité : 420 (A4.2) – Réaliser des visites de prospection pour présenter les produits PAM et initier le dialogue commercial

Livrable : Au moins 25 visites de prospection réalisées auprès de points de vente identifiés, comptes rendus archivés

Ressources humaines : Responsable de prospection commerciale, 1 bénéficiaire-leader en appui

Durée / niveau d'effort : 4 jours de prospection

Période : Mois 7–8

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Salaires / honoraires	Responsable de prospection commerciale	3 jours	800	3 jours	2 400	0
Jetons / indemnités	Bénéficiaire-leader accompagnant	3 jours	200	3 jours	600	0
Frais de déplacement	Transport vers les points de vente (25 visites)	1 forfait	600	—	600	0
Matériel de promotion	Flyers, fiches produits, petits échantillons	1 forfait	400	—	400	0
TOTAL activité 420					4 000	0

FICHE ACTIVITÉ 430 (A4.3)

Extrant : 400

Activité : 430 (A4.3) – Formaliser au moins deux accords de vente pilote avec des points de vente volontaires

Livrable : Minimum 2 accords de vente pilote signés (engagement écrit, bon de commande ou protocole d’essai)

Ressources humaines : Responsable de prospection, appui juridique/contractuel, porteuse de projet

Durée / niveau d’effort : 3 jours (négociations + formalisation)

Période : Mois 8

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d’unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d’effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Salaires / honoraires	Responsable de prospection (négociation contrats)	2 jours	800	2 jours	1 600	0
Honoraires	Appui juridique / conseil contractuel	1 forfait	1 000	—	1 000	0
Frais impression	Impression des projets de contrat & versions finales	1 forfait	600	—	600	0
Frais de séjour	Collations / rafraîchissements réunions partenaires	1 forfait	800	—	800	0
TOTAL activité 430					4 000	0

FICHE ACTIVITÉ 440 (A4.4)

Extrant : 400

Activité : 440 (A4.4) – Organiser et documenter une vente pilote des produits PAM auprès des points de vente engagés

Livrable : Au moins 2 ventes pilotes réalisées, avec bons de livraison, reçus de vente et fiches de suivi complétées

Ressources humaines : Porteuse du projet, bénéficiaires responsables des ventes, assistante commerciale

Durée / niveau d'effort : 3 jours (préparation, livraison, suivi)

Période : Mois 9–10

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Intrants / matériel	Emballages, étiquettes, boîtes, supports PLV	1 forfait	1 500	—	1 500	0
Frais de déplacement	Transport produits vers 2–3 points de vente	1 forfait	800	—	800	0
Salaires / jetons	Indemnités pour 2 bénéficiaires en charge des ventes	3 jours	300	3 jours	900	0
Frais de suivi	Petits frais de caisse, documentation, archivage	1 forfait	800	—	800	0
TOTAL activité 440					4 000	0

FICHE ACTIVITÉ 450 (A4.5)

Extrant : 400

Activité : 450 (A4.5) – Évaluer la performance de la vente pilote (volumes vendus, retour des points de vente, ajustements)

Livrable : 1 rapport d'évaluation complet de la vente pilote (analyse ventes, marges, retours qualitatifs)

Ressources humaines : Responsable suivi-évaluation, assistante de projet, représentantes des bénéficiaires

Durée / niveau d'effort : 3 jours (collecte données + analyse + restitution)

Période : Mois 10–11

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Salaires / honoraires	Responsable de suivi-évaluation	2 jours	1 000	2 jours	2 000	0
Salaires / honoraires	Assistante de projet (collecte & saisie des données)	2 jours	600	2 jours	1 200	0
Frais impression	Questionnaires, fiches d'entretien, rapport final	1 forfait	800	—	800	0
Frais de séjour	Collations réunion de restitution avec 20 femmes	20 collations	50	—	1 000	0
TOTAL activité 450					5 000	0

FICHE ACTIVITÉ 510 (A5.1)

Extrant : 500 – Dispositif de gouvernance, de suivi-évaluation et de pérennisation fonctionnel

Activité : 510 (A5.1) – Mettre en place les instances de gouvernance (COPIL, CCT)

Livrable : COPIL et CCT officiellement constitués, mandats validés, calendrier de réunions adopté

Ressources humaines : Coordinateur·rice du projet, représentant·e HAF/INDH, représentant·e Commune

Durée / niveau d'effort : 2 jours (préparation + réunion d'installation)

Période : Mois 1

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Salaires / honoraires	Porteuse de projet (préparation, animation)	1 jour	800	1 jour	800	0
Frais de séjour	Collations réunion d'installation (≈ 12 membres)	12 collations	50	—	600	0
Frais de déplacement	Déplacements partenaires locaux (HAF, INDH, Commune)	1 forfait	800	—	800	0
Frais impression	Mandats, règlements internes, calendrier affiché	1 forfait	800	—	800	0
TOTAL activité 510					3 000	0

FICHE ACTIVITÉ 520 (A5.2)

Extrant : 500

Activité : 520 (A5.2) – Assurer le fonctionnement régulier et inclusif des instances (COPIL/CCT)

Livrable : Au moins 4 réunions COPIL et 6 réunions CCT tenues, ordres du jour et listes de présence archivés

Ressources humaines : Porteuse de projet, secrétaire de séance, membres COPIL/CCT

Durée / niveau d'effort : suivi sur toute l'année (forfait)

Période : Mois 2–12

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Frais de séjour	Collations réunions COPIL/CCT (10 réunions)	10 réunions	120	—	1 200	0
Salaires / honoraires	Secrétariat (préparation ODJ, prises de notes, PV)	4 jours cumulés	200	4 jours	800	0
Frais impression	Ordres du jour, PV, plans d'action, affichage	1 forfait	600	—	600	0
Frais de déplacement	Petite enveloppe transport membres éloignés (forfait)	1 forfait	400	—	400	0
TOTAL activité 520					3 000	0

FICHE ACTIVITÉ 530 (A5.3)

Extrant : 500

Activité : 530 (A5.3) – Mettre en œuvre le Cadre de Mesure du Rendement (CMR)

Livrable : Outils CMR finalisés, équipe projet formée, premières données renseignées (≥ 90 % des activités suivies)

Ressources humaines : Responsable S&E, équipe projet (porteuse de projet + assistante)

Durée / niveau d'effort : 2 jours d'atelier + 1 jour de consolidation

Période : Mois 3–4

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Honoraires	Responsable S&E (adaptation outils, animation atelier)	1 forfait	1 800	2 jours	1 800	0
Frais de séjour	Collations atelier de formation (≈ 10 participants)	10 collations	50	—	500	0
Frais impression	Fiches CMR, tableaux de bord, supports de formation	1 forfait	700	—	700	0
TOTAL activité 530					3 000	0

FICHE ACTIVITÉ 540 (A5.4)

Extrant : 500

Activité : 540 (A5.4) – Produire les rapports de suivi-évaluation et partager les résultats

Livrable : Rapports périodiques de S&E (intermédiaire + final) produits et partagés avec HAF, INDH, Commune, femmes bénéficiaires

Ressources humaines : Responsable S&E, assistante projet, coordinatrice

Durée / niveau d'effort : 3 jours (analyse + rédaction + restitution)

Période : Mois 6–12

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d'unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d'effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Salaires / honoraires	Responsable S&E (analyse des données, rédaction)	2 jours	800	2 jours	1 600	0
Salaires / honoraires	Assistante projet (mise en forme, annexes)	1 jour	400	1 jour	400	0
Frais impression	Rapports papier, résumés graphiques	1 forfait	600	—	600	0
Frais de séjour	Collations séance de restitution avec les 20 femmes	8 collations	50	—	400	0
TOTAL activité 540					3 000	0

FICHE ACTIVITÉ 550 (A5.5)

Extrant : 500

Activité : 550 (A5.5) – Élaborer un plan de pérennisation et d’ancrage institutionnel de la filière PAM

Livrable : 1 plan de pérennisation validé (choix de statut : coopérative, GIE, etc.), premières démarches administratives lancées

Ressources humaines : Consultant·e en économie sociale / droit coopératif, porteuse de projet, représentantes des femmes

Durée / niveau d’effort : 2 jours (diagnostic + atelier de co-construction)

Période : Mois 10–12

Type de dépenses	Catégorie	Nombre d’unités	Coût unitaire (DH)	Niveau d’effort	Total (DH)	Contribution en nature (DH)
Honoraires	Consultant·e (analyse options + rédaction plan)	1 forfait	1 800	2 jours	1 800	0
Frais de séjour	Collations atelier de co-construction (20 femmes)	20 collations	50	—	1 000	0
Frais impression	Synthèse du plan, fiches statutaires, check-list démarches	1 forfait	200	—	200	0
TOTAL activité 550					3 000	0
